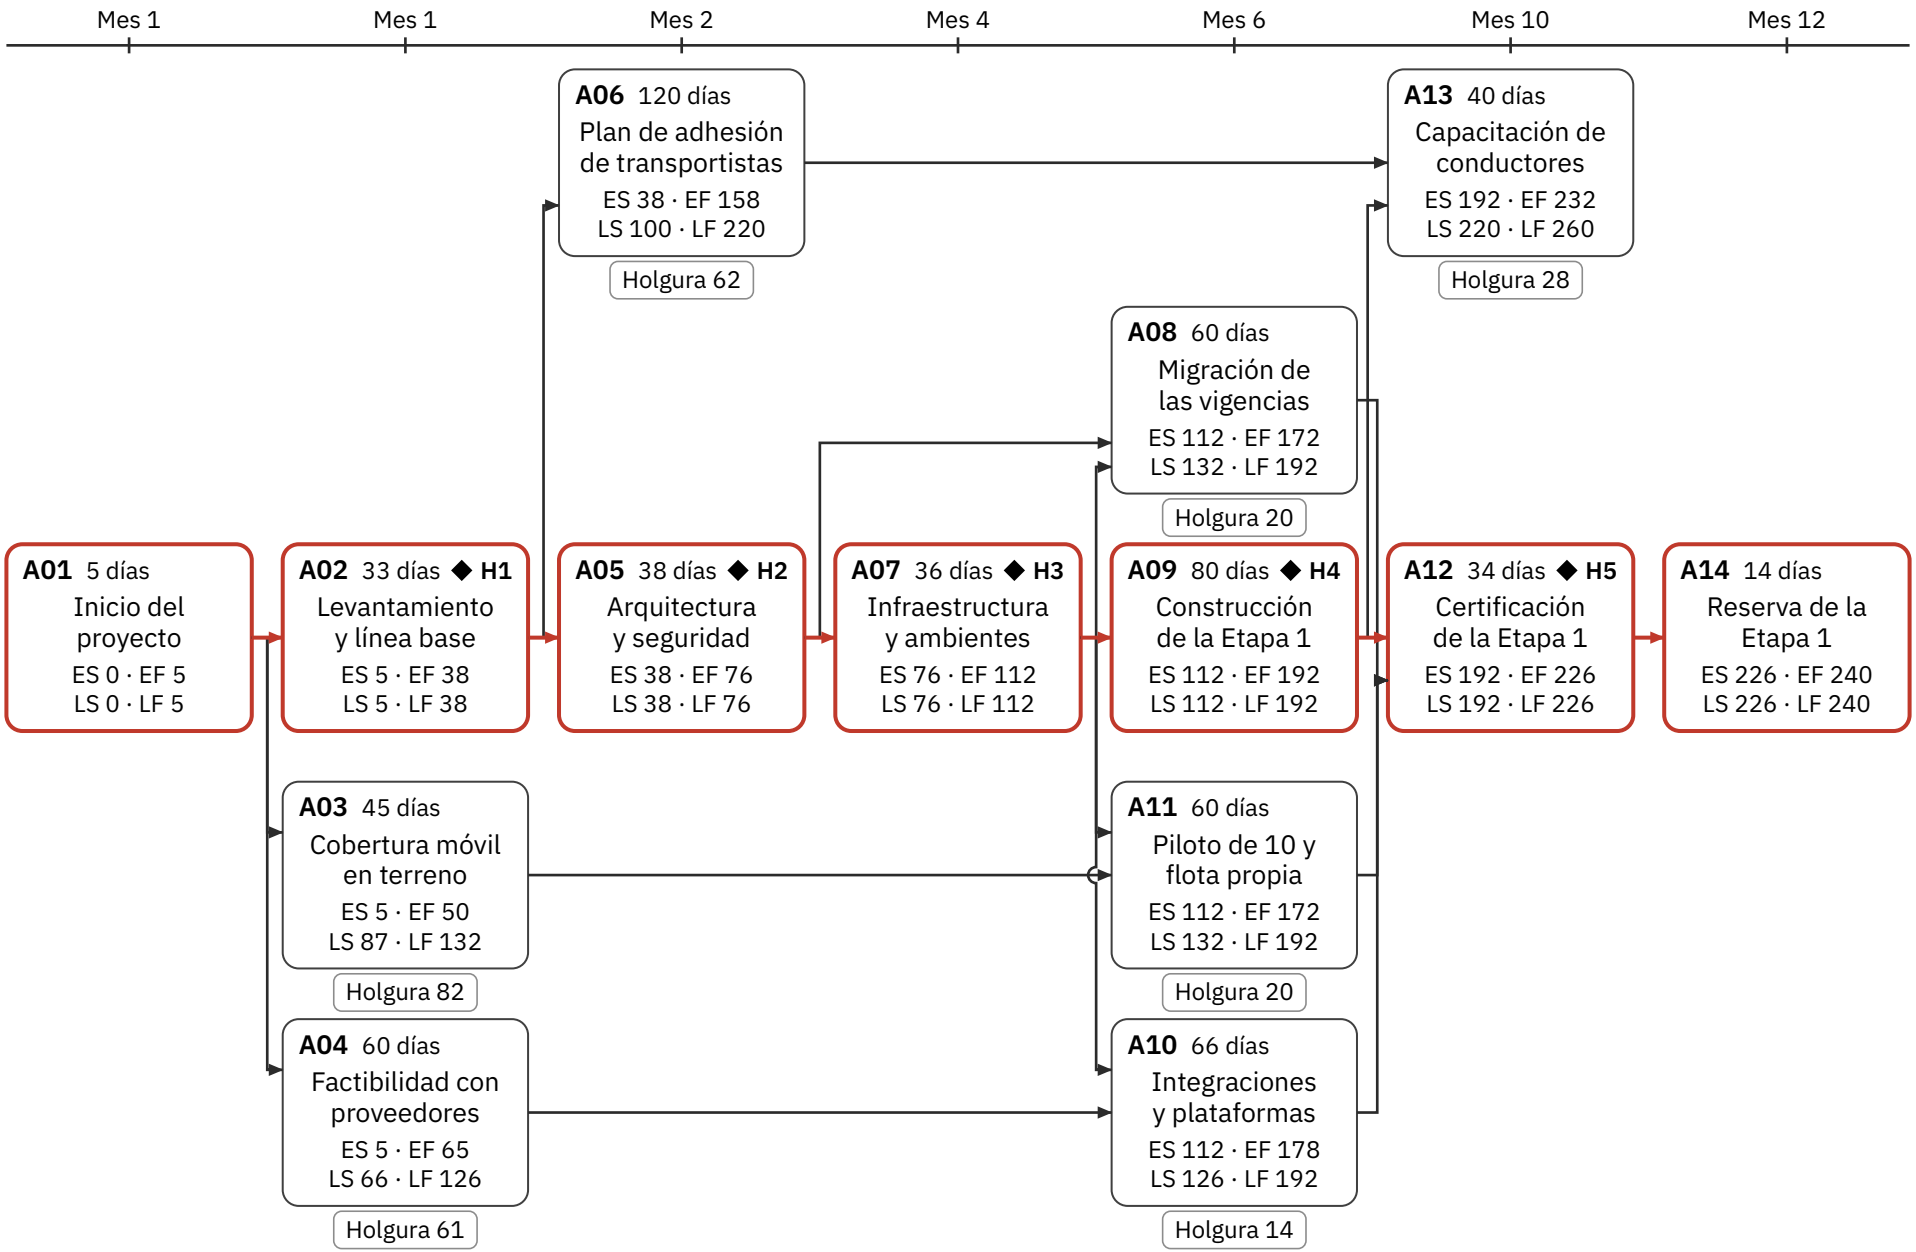
Mes 1
Mes 1
Mes 2
Mes 4
Mes 6
Mes 10
Mes 12
A01 5 días
Inicio del proyecto
ES 0 · EF 5
LS 0 · LF 5
A02 33 días ◆ H1
Levantamiento y línea base
ES 5 · EF 38
LS 5 · LF 38
A03 45 días
Cobertura móvil en terreno
ES 5 · EF 50
LS 87 · LF 132
Holgura 82
A04 60 días
Factibilidad con proveedores
ES 5 · EF 65
LS 66 · LF 126
Holgura 61
A05 38 días ◆ H2
Arquitectura y seguridad
ES 38 · EF 76
LS 38 · LF 76
A06 120 días
Plan de adhesión de transportistas
ES 38 · EF 158
LS 100 · LF 220
Holgura 62
A07 36 días ◆ H3
Infraestructura y ambientes
ES 76 · EF 112
LS 76 · LF 112
A08 60 días
Migración de las vigencias
ES 112 · EF 172
LS 132 · LF 192
Holgura 20
A09 80 días ◆ H4
Construcción de la Etapa 1
ES 112 · EF 192
LS 112 · LF 192
A10 66 días
Integraciones y plataformas
ES 112 · EF 178
LS 126 · LF 192
Holgura 14
A11 60 días
Piloto de 10 y flota propia
ES 112 · EF 172
LS 132 · LF 192
Holgura 20
A12 34 días ◆ H5
Certificación de la Etapa 1
ES 192 · EF 226
LS 192 · LF 226
A13 40 días
Capacitación de conductores
ES 192 · EF 232
LS 220 · LF 260
Holgura 28
A14 14 días
Reserva de la Etapa 1
ES 226 · EF 240
LS 226 · LF 240
