audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 12

Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Subdocumento N.º 12. Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas
Contenido	Estructura del proyecto, roles, dotación por fase, decisiones de hacer o comprar, subcontratistas y continuidad.
Formularios	Formulario T-8, en el archivo AUDIT-Formulario-T-8.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento12.pdf`
Folios	Del 1 al 13, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 12

Índice

12 . . . . . **5**
12.1 Estructura organizacional del proyecto 5
12.2 Equipo clave 7
12.3 Curva de dotación por fase 8
12.4 Decisiones de hacer o comprar 9
12.5 Subcontratistas y socios 10
12.6 Gestión del conocimiento y continuidad 10
Referencias 12
Declaración de uso de IA 12

FIGURAS

12.1 Estructura del proyecto: el Jefe de Proyecto y sus cuatro líneas, con los roles de cada una 6
12.2 Personas por mes según el Formulario T-15, con la parte que corresponde al equipo clave 8

TABLAS

12.1 Matriz de asignación por grupo de paquetes de la EDT 6

RESUMEN DE APERTURA

Este subdocumento presenta quién hace el proyecto y quién responde por cada parte. El equipo clave son los seis roles que exige el FEP01, Artículo 34.1, p. 22, nominados y con su dedicación en el Formulario T-8. La dotación sube de 14 personas en los meses 1 y 2 a 37 en los meses 13 a 17 y baja a 16 en la operación, igual que en el Formulario T-15. Lo que no hace audIT lo hacen proveedores y socios que suman cerca del 15,6 % del valor del contrato, bajo el tope del 40 % del FEP01, Artículo 73.1, p. 38.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Una estructura del proyecto con un responsable por cada entregable y una matriz de asignación.
- Un equipo clave nominado, con certificaciones, dedicación y meses de participación en el Formulario T-8.
- Una curva de dotación por fase que coincide con la nivelación de recursos del Formulario T-15.
- La lista de subcontratistas y socios con su rol, su peso en el valor y su régimen de control.

El equipo es el que declara el Subdocumento 1: 22 profesionales de planta de audIT, de los cuales 21 trabajan en el proyecto, y 16 personas de refuerzo que audIT incorpora para el despliegue y la segunda etapa (FEP01, Formulario T-15, p. 65). La sección 12.1 ordena el proyecto, la 12.2 presenta el equipo clave, la 12.3 la dotación por fase, la 12.4 lo que audIT hace y lo que compra, la 12.5 los subcontratistas y socios, y la 12.6 cómo se conserva el conocimiento cuando alguien se va.

12.1 Estructura organizacional del proyecto

El proyecto tiene cuatro líneas bajo el Jefe de Proyecto, como muestra la Figura 12.1. La dirección técnica diseña y construye. El aseguramiento vigila la seguridad y la calidad con independencia de quien construye. La implantación lleva la solución a los terminales, a los camiones y a las personas. La operación sostiene el servicio desde que entra en producción. Las decisiones que cruzan las líneas suben a los comités del FEP01, Artículo 71, p. 37: el Comité de Proyecto cada quince días, el de Arquitectura cada mes, el Ejecutivo cada mes y, desde el mes 13, el de Operación.

El Jefe de Proyecto responde ante el mandante por el contrato completo. El Arquitecto de Solución decide la arquitectura y lleva su registro de decisiones. El Encargado de Seguridad de la Información y el Líder de Calidad dependen del Jefe de Proyecto y no de la dirección técnica, para que puedan detener una entrega que no cumple. El Líder de Operación es además el gerente de servicio dedicado que pide FEP02, RT-21.02, p. 35. La Tabla 12.1 agrupa los paquetes del Formulario T-14 y marca quién responde por cada grupo (A), quién lo ejecuta (R), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I).

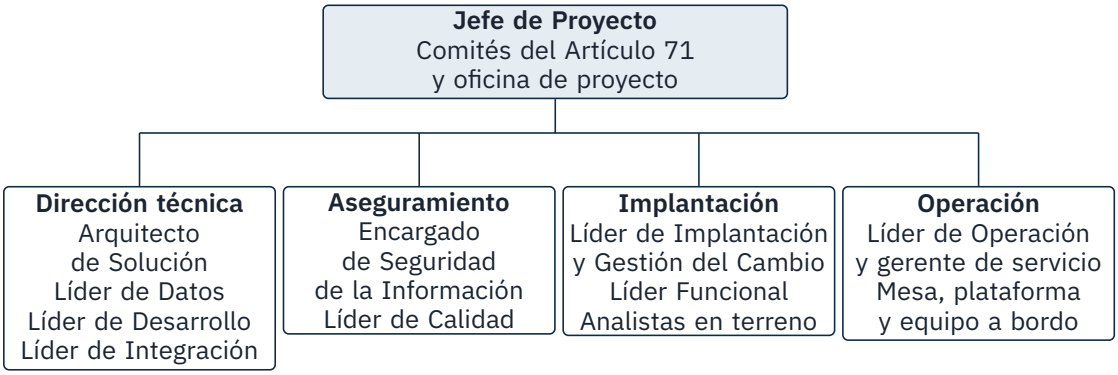


Figura 12.1 Estructura del proyecto: el Jefe de Proyecto y sus cuatro líneas, con los roles de cada una

Tabla 12.1 Matriz de asignación por grupo de paquetes de la EDT

Paquetes de la EDT	JP	AS	ESI	LD	LDS	LC	LO	LIN	LIM	LF
1.1 y 1.2 Dirección y comunicaciones	A	C	C	I	I	C	C	I	C	C
2.1 Alcance y trazabilidad	C	C	I	C	C	C	I	C	I	A
2.4 Arquitectura, seguridad y modelo de datos	I	A	R	R	C	C	C	C	I	I
3.1, 3.3 y 3.4 Ambientes, trazas y sala	I	C	C	I	C	C	A	I	I	I
3.2 Identidad y cifrado	I	C	A	C	C	C	R	I	I	I
4.2 y 11.1 Montaje a bordo y capacitación	I	I	I	I	I	C	C	C	A	C
4.3 y 6.1 a 6.5 Integraciones y retiro del sistema de 2013	I	C	C	C	R	C	C	A	I	I
5.1 a 5.7 y 8.1 a 8.4 Contextos y portales	I	C	C	C	A	C	I	C	I	C
7.1 a 7.3 y 8.5 Migración y analítica	I	C	C	A	R	C	I	C	I	C
9.1 a 9.3 Adhesión de transportistas	C	I	C	I	I	I	I	I	C	A
10.1 a 10.3 Pruebas	I	C	C	C	R	A	C	R	C	C
11.2 y 11.3 Marchas blancas	C	C	C	C	R	C	R	R	A	C
11.4 y 13.1 a 13.3 Estabilización y operación	I	C	C	C	C	C	A	C	I	I
13.4 Mantención evolutiva	I	C	C	C	A	C	C	C	I	I
12.1 a 12.3 y 12.5 Innovaciones	C	A	C	C	R	C	C	C	I	C

JP, Jefe de Proyecto. AS, Arquitecto de Solución. ESI, Encargado de Seguridad de la Información. LD, Líder de Datos. LDS, Líder de Desarrollo. LC, Líder de Calidad y Pruebas. LO, Líder de Operación. LIN, Líder de Integración. LIM, Líder de Implantación y Gestión del Cambio. LF, Líder Funcional. Fuente: elaboración propia sobre el Formulario T-14.

Cada grupo tiene una sola A, y es el mismo rol responsable que el Formulario T-14 asigna a sus paquetes. Los paquetes 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 4.1 y 12.4 no aparecen en la tabla porque su responsable es un rol que ya figura en ella o un ingeniero de especialidad, y están en el Formulario T-14. La seguridad y la calidad tienen su propio responsable y el desarrollo solo ejecuta en esos grupos, que es la separación que exige el aseguramiento independiente del Subdocumento 9.

12.2 Equipo clave

El equipo clave son los seis roles habilitantes del FEP01, Artículo 34.1, p. 22. El Subdocumento 1 los nomina y deja a este subdocumento su trayectoria, sus certificaciones y su dedicación. Los seis son profesionales de planta de audIT con entre 9 y 14 años de experiencia en el trabajo que les toca en este contrato.

El Jefe de Proyecto es Alejandro Hermosilla Díaz, certificado PMP, con 14 años dirigiendo proyectos de modernización de plataformas digitales y sistemas de misión crítica en logística y transporte. Conduce la planificación, los comités del FEP01, Artículo 71, p. 37 y la relación con la contraparte técnica. El Arquitecto de Solución es Esteban Valenzuela Lagos, con las certificaciones Microsoft Azure Solutions Architect Expert y TOGAF 9.2 y 12 años en arquitecturas de nube híbrida, microservicios y sistemas de alta concurrencia. Decide la arquitectura de los Subdocumentos 4 y 5 y lleva el Comité de Arquitectura junto al Encargado de Seguridad.

El Encargado de Seguridad de la Información es Mauricio Arancibia Toledo, con CISSP, CISM y auditor líder ISO/IEC 27001, y 11 años en ciberseguridad industrial, criptografía y protección de datos personales conforme a la Ley N.º 21.719. Responde por el plan de seguridad, el cifrado de campo y la certificación ISO/IEC 27001 de audIT. El Líder de Datos es Rodrigo Sanhueza Parra, con CDMP y Azure Data Engineer Associate, y 9 años en datos distribuidos, flujos de eventos en tiempo real y bases relacionales y de series de tiempo. Responde por el modelo de datos, la migración de las cerca de 6.000 vigencias y el repositorio analítico.

La Líder de Calidad es Claudia Navarrete Rivas, con ISTQB Full Advanced Level como Test Manager y Technical Test Analyst, y 10 años dirigiendo compuertas de calidad y pruebas automatizadas de regresión, carga y estrés. Responde por el plan de calidad del Subdocumento 9 y por la aceptación de cada hito. El Líder de Operación es Felipe Morales Cárdenas, con CKA y Red Hat Certified Engineer, y 10 años en orquestación de Kubernetes, telemetría industrial, redes vehiculares SAE J1939 y soporte 24/7 en terreno. Dirige la plataforma, la mesa de servicio y el ciclo de vida del equipo a bordo, y en la operación es el gerente de servicio.

Los seis trabajan a tiempo completo en los meses 1 a 20. En la operación, según el Subdocumento 1, el Líder de Operación sigue a tiempo completo, el Jefe de Proyecto, el Encargado de Seguridad y el Líder de Datos quedan con la mitad de su tiempo, y el Arquitecto de Solución y la Líder de Calidad con un cuarto. Eso suma tres jornadas completas, 480 de las 2.560 horas mensuales de la operación, y esas horas están dentro de las 16 personas del Formulario T-15, que es también como las cuenta el Sobre N.º 3. El Líder de Datos y la Líder de Calidad las dedican sobre todo al paquete 13.4, donde están los cierres de los meses 21 a 24 (Subdocumento 11). El Formulario T-8 trae cada rol con su nombre, sus certificaciones, su dedicación y sus meses, y los currículos y las cartas de compromiso van en el Sobre N.º 1. Los demás roles de la estructura salen de la planta o del refuerzo que declara el Formulario T-15, y se nominan en el plan de dirección del mes 1.

12.3 Curva de dotación por fase

La dotación sigue la nivelación de recursos del Formulario T-15 mes a mes, como muestra la Figura 12.2. El proyecto parte con 14 personas en los meses 1 y 2, que hacen el levantamiento y el plan, y sube a 24 en los meses 3 a 5 con la arquitectura y los ambientes. Llega a 30 en los meses 6 a 9, cuando empiezan la construcción y el montaje a bordo, y a 33 en los meses 10 a 12, con la capacitación. El peak es de 37 personas en los meses 13 a 17, cuando la marcha blanca y la estabilización de la Etapa 1 conviven con la construcción de la Etapa 2. De esas 37, 21 son de planta y 16 de refuerzo. Después baja a 30 en el mes 18 y a 26 en los meses 19 y 20, y la operación sigue con 16 personas desde el mes 21 hasta el 56. La implementación suma 93.760 horas y la operación 92.160.

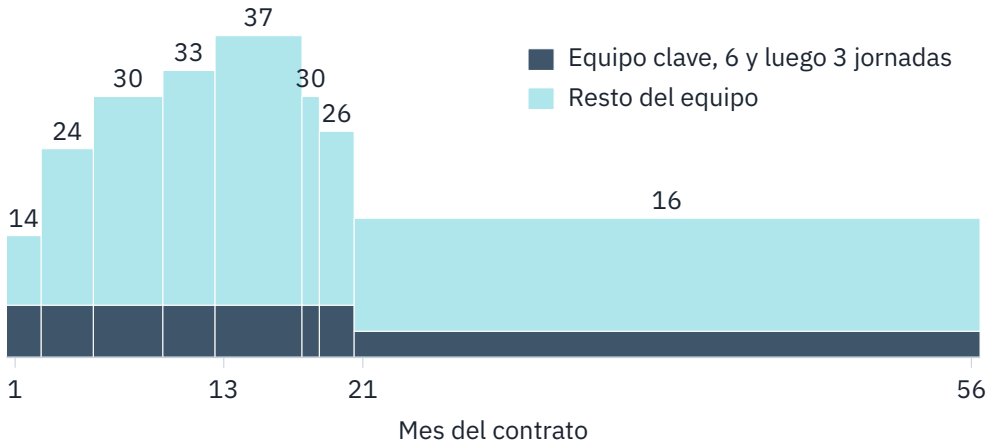


Figura 12.2 Personas por mes según el Formulario T-15, con la parte que corresponde al equipo clave

La forma de la curva tiene una razón. El peak contiene los meses 13 a 15, en que el Subdocumento 7 divide el equipo en dos escuadras, una que estabiliza lo que ya opera y otra que construye lo que viene, y por eso no se puede aplanar sin atrasar la Etapa 2. Las 16 personas de refuerzo son el Líder Funcional, el Líder de Integración, el Líder de Implantación y Gestión del Cambio, siete analistas de implantación en terreno, dos ingenieros SRE, dos desarrolladores, un ingeniero de datos y un analista de pruebas. Las 16 personas de la operación se reparten en la mesa de servicio, la plataforma, el equipo a bordo y la mantención evolutiva, con el dimensionamiento de los Subdocumentos 10 y 11.

La curva también se comprobó contra el trabajo por tarea, como pidió la revisión del Informe 2. El mes 9 es el más cargado de construcción. La estimación por actividad del software, los datos y las integraciones pide ese mes 3.354 horas de arquitectura, desarrollo, interfaces, seguridad, datos, pruebas y plataforma, unas 21 jornadas completas. Sumados el montaje a bordo, las pruebas transversales, la dirección y la preparación de las innovaciones, la demanda del mes llega a cerca de 4.283 horas, y de las 4.800 que dan las 30 personas del Formulario T-15 quedan unas 517 para las cargas menores que faltan por detallar. Por perfil, seguridad y plataforma quedan justo en su capacidad ese mes, con unas 10 y 21 horas por sobre una jornada, y esa diferencia la toman otros ingenieros de planta con el perfil

compatible. Las cuentas de usuario del repositorio siguen la misma curva: 33 en la primera etapa, 37 en el peak y 16 desde el mes 25.

12.4 Decisiones de hacer o comprar

La regla es construir lo que es propio del negocio de Curimón, comprar lo que el mercado ya hace mejor y contratar lo que exige independencia o una especialidad que no conviene mantener en planta. Cada compra se compara por su costo total de 56 meses, que incluye alta, canon, consumo, alojamiento, actualización, soporte y salida, y por compatibilidad, permisos sobre los datos, ubicación, portabilidad y derecho de uso. Un precio bajo no basta para decidir.

audIT construye el software de los seis contextos, las reglas de asignación y liquidación y las interfaces web y móviles. La alternativa era comprar un sistema de gestión de transporte y parametrizarlo, pero ninguno acredita cubrir a la vez la verificación de jornada, el documento de transporte y la convivencia con el sistema de 2013 que piden los Subdocumentos 3 y 4. También construye los adaptadores hacia el sistema contable, la telemetría de fábrica y las plataformas de posicionamiento, sobre contratos autorizados y sin tocar sus bases, porque el sistema contable conserva la emisión tributaria y cada dato tiene su dueño. La migración se construye como un proceso reproducible con revisión funcional, porque las cerca de 6.000 vigencias se verifican una por una contra su respaldo. Lo que se construye es del mandante desde su creación (FEP01, Artículo 84.1, p. 43). audIT tiene para eso siete ingenieros de software y cinco de firmware y hardware en su planta, certificación ISO 9001 vigente y los tres proyectos de misión crítica del Formulario T-6 (Subdocumento 1).

audIT compra como servicio lo que no es propio del negocio. Las bases de datos, la caché, los eventos, la identidad y la custodia de claves son servicios administrados de Azure, porque operar clústeres propios recargaría a un área de tecnología de nueve personas (Caso, numeral 7.4, p. 16) con parches, alta disponibilidad y respaldos. audIT es socio Microsoft CSP, que es la condición de socio del proveedor de nube que pide el FEP01, Artículo 34.1, p. 22. Las bibliotecas y herramientas abiertas se usan con su inventario de componentes y no se reimplementan. GitLab se contrata en su edición Premium autoadministrada, dentro del perímetro del proyecto, en vez de la gratuita o la de software como servicio. SonarQube se contrata en su edición Developer porque la gratuita no analiza Dart ni las ramas de integración que usa el Subdocumento 6.

El hardware se compra a fabricantes y no se fabrica. Los equipos de campo y de red los compra el mandante con la especificación del Formulario T-11, y los servidores del nodo de continuidad de San Bernardo los provee audIT. Los servicios que la solución consume, como Azure, el circuito ExpressRoute, los planes móviles y el tiempo de aire satelital, los contrata y paga audIT, con la suscripción de Azure a nombre del mandante. La instalación a bordo no se subcontrata: la hace el personal de audIT que integró el equipo en su laboratorio.

audIT contrata lo que pide independencia o una especialidad puntual. Las pruebas de penetración y la custodia de las fuentes las hace un tercero porque su valor está en no depender de quien construye. Un laboratorio acreditado ensaya el equipo a bordo contra polvo, agua y vibración entre los meses 4 y 7, y el banco de

pruebas del bus CAN se arrienda entre los meses 4 y 9. La plataforma de aprendizaje en línea y sus contenidos se contratan para la capacitación de la Etapa 1, y los talleres presenciales en los cinco terminales, la capacitación de la Etapa 2 y la reinducción anual de la operación los dicta un organismo de capacitación. Los talleres de ergonomía de la innovación 5 también son externos.

12.5 Subcontratistas y socios

El Formulario T-8 lista cada proveedor y socio con el servicio que da y su peso en el valor total que factura el contrato. El mayor es Microsoft, con cerca del 8,8 %, por el consumo de Azure y Entra ID. Le siguen Ground Control, con cerca del 3,2 % por el tiempo de aire satelital, y los fabricantes y mantenedores del hardware, con cerca del 1,5 %. El resto pesa menos del 1 % cada uno. En total suman cerca del 15,6 %, bajo el tope del 40 % del FEP01, Artículo 73.1, p. 38. Los porcentajes salen de las partidas del Sobre N.º 3, que es donde están los montos. Los cuatro centros técnicos aliados de la red regional del Subdocumento 1 también se declaran en el formulario, aunque no tienen una partida propia en el Sobre N.º 3.

Ningún proveedor opera el núcleo del negocio, como prohíbe el FEP01, Artículo 73.2, p. 38: las aplicaciones las construye y opera audIT. Los datos sí quedan en Azure, y por eso la suscripción está a nombre del mandante, que autoriza expresamente al proveedor de nube. Ese es también el proveedor que más pesa, y el riesgo de quedar atado a él lo acota la estrategia de reversibilidad del Subdocumento 4, con la infraestructura como código y los datos exportables en formatos abiertos.

El régimen de control tiene cinco partes. Primero, cada subcontratación tiene la autorización previa y escrita del mandante (FEP01, Artículo 73.1, p. 38), y también la tiene el reemplazo de un proveedor, que debe mantener o mejorar las condiciones del anterior. Segundo, todo proveedor con acceso a datos del mandante queda declarado, firma un acuerdo de tratamiento de datos conforme a la Ley N.º 21.719 y queda sujeto a auditoría (FEP01, Artículo 73.4, p. 38). Tercero, cada contrato traslada al proveedor los plazos que audIT necesita para cumplir los niveles de servicio, restados desde el FEP01, Artículo 78.2, p. 40 (Subdocumento 10). Cuarto, el proveedor cumple los mismos estándares de seguridad, confidencialidad, calidad y cumplimiento laboral que audIT, que le pide sus certificados laborales y previsionales al contratarlo y en cada renovación (FEP01, Artículo 73.3, p. 38). Quinto, el Comité de Proyecto revisa a los proveedores cada quince días durante la implementación y el Comité de Operación cada mes desde el mes 13, con el informe de nivel de servicio. audIT responde solidariamente por todos ellos (FEP01, Artículo 73.3, p. 38).

12.6 Gestión del conocimiento y continuidad

El FEP01, Artículo 76.4, p. 39 pide que la salida de cualquier persona no comprometa el proyecto. La regla de audIT es que todo conocimiento crítico lo tengan al menos dos personas, con la revisión cruzada que describe el Subdocumento 1. Cada rol del equipo clave tiene un suplente designado dentro de la planta. El Jefe de Proyecto tiene como suplente a uno de los tres analistas de la oficina de proyecto. El Arquitecto de Solución y el Líder de Desarrollo se cubren entre sí. El Encargado

de Seguridad tiene como suplente al Líder de Operación, que ejecuta con él la identidad y el cifrado. El Líder de Datos tiene al ingeniero de datos, la Líder de Calidad al ingeniero de pruebas y automatización y el Líder de Operación a uno de los ingenieros de la operación de la plataforma. Las decisiones quedan en el registro de arquitectura, los procedimientos en los libros de operación y las soluciones en la base de conocimiento (Subdocumento 10), de modo que lo que se sabe no depende de una sola memoria.

Las 16 personas de refuerzo entran en pareja con un profesional de planta que ya conoce su frente, y su primer trabajo se revisa antes de integrarse. Cada una recibe su cuenta del repositorio y su identidad en Entra ID con acceso condicional y doble factor, y el día en que deja el proyecto se le retiran los accesos. Así el peak de 37 personas no deja conocimiento en manos de quien se va en el mes 18.

Un reemplazo del equipo clave necesita la autorización previa y escrita del mandante y recae en un profesional de perfil igual o superior, con quince días hábiles de traslape y sin costo para Curimón (FEP01, Artículo 76.2, p. 39). La rotación no puede pasar del 30 % del equipo clave en doce meses (FEP01, Artículo 76.3, p. 39), que con seis personas significa no más de una salida al año. Para retener al equipo, audIT aplica durante todo el contrato el programa de entrenamiento y certificación del Subdocumento 1.

El conocimiento también pasa al mandante. Las personas administradoras y el equipo técnico de Curimón se evalúan y certifican al cierre de cada marcha blanca (FEP02, RT-22.05, p. 38). Los libros de operación los prueba el personal de Curimón antes de recibirlos (FEP02, RT-21.04, p. 35), y después del paso a producción de la Etapa 2 audIT acompaña al equipo técnico del mandante durante al menos seis meses (FEP02, RT-22.07, p. 38). Durante la operación siguen las dos jornadas anuales de actualización del Subdocumento 10.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción y 12.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de la estructura del proyecto, organigrama dibujado en TikZ y matriz de asignación armada desde los responsables del Formulario T-14	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: líneas del proyecto, comités del Artículo 71 y una sola A por grupo igual al responsable del Formulario T-14.
12.2 y 12.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción del equipo clave, su trayectoria y la curva de dotación desde el Subdocumento 1, el Formulario T-15 y la conciliación de capacidad del Informe 3, y gráfico de dotación dibujado en TikZ	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: nombres, certificaciones, años de experiencia y dedicaciones frente al Subdocumento 1, personas por tramo frente al Formulario T-15 y horas del mes 9.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
12.4 a 12.6	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de hacer o comprar, subcontratistas y continuidad, con las decisiones de compra del Informe 3 y los porcentajes calculados desde las partidas del Sobre N.º 3	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: decisiones de compra, porcentajes y tope del Artículo 73, régimen de control, reglas del Artículo 76 y suplentes dentro de la planta.
Formulario T-8	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Llenado del formulario desde el Subdocumento 1, los Formularios T-14 y T-15 y las partidas de proveedores del Informe 3	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: roles, meses de participación, servicio y porcentaje de cada proveedor.
