
Horizonte contractual M1-M56

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

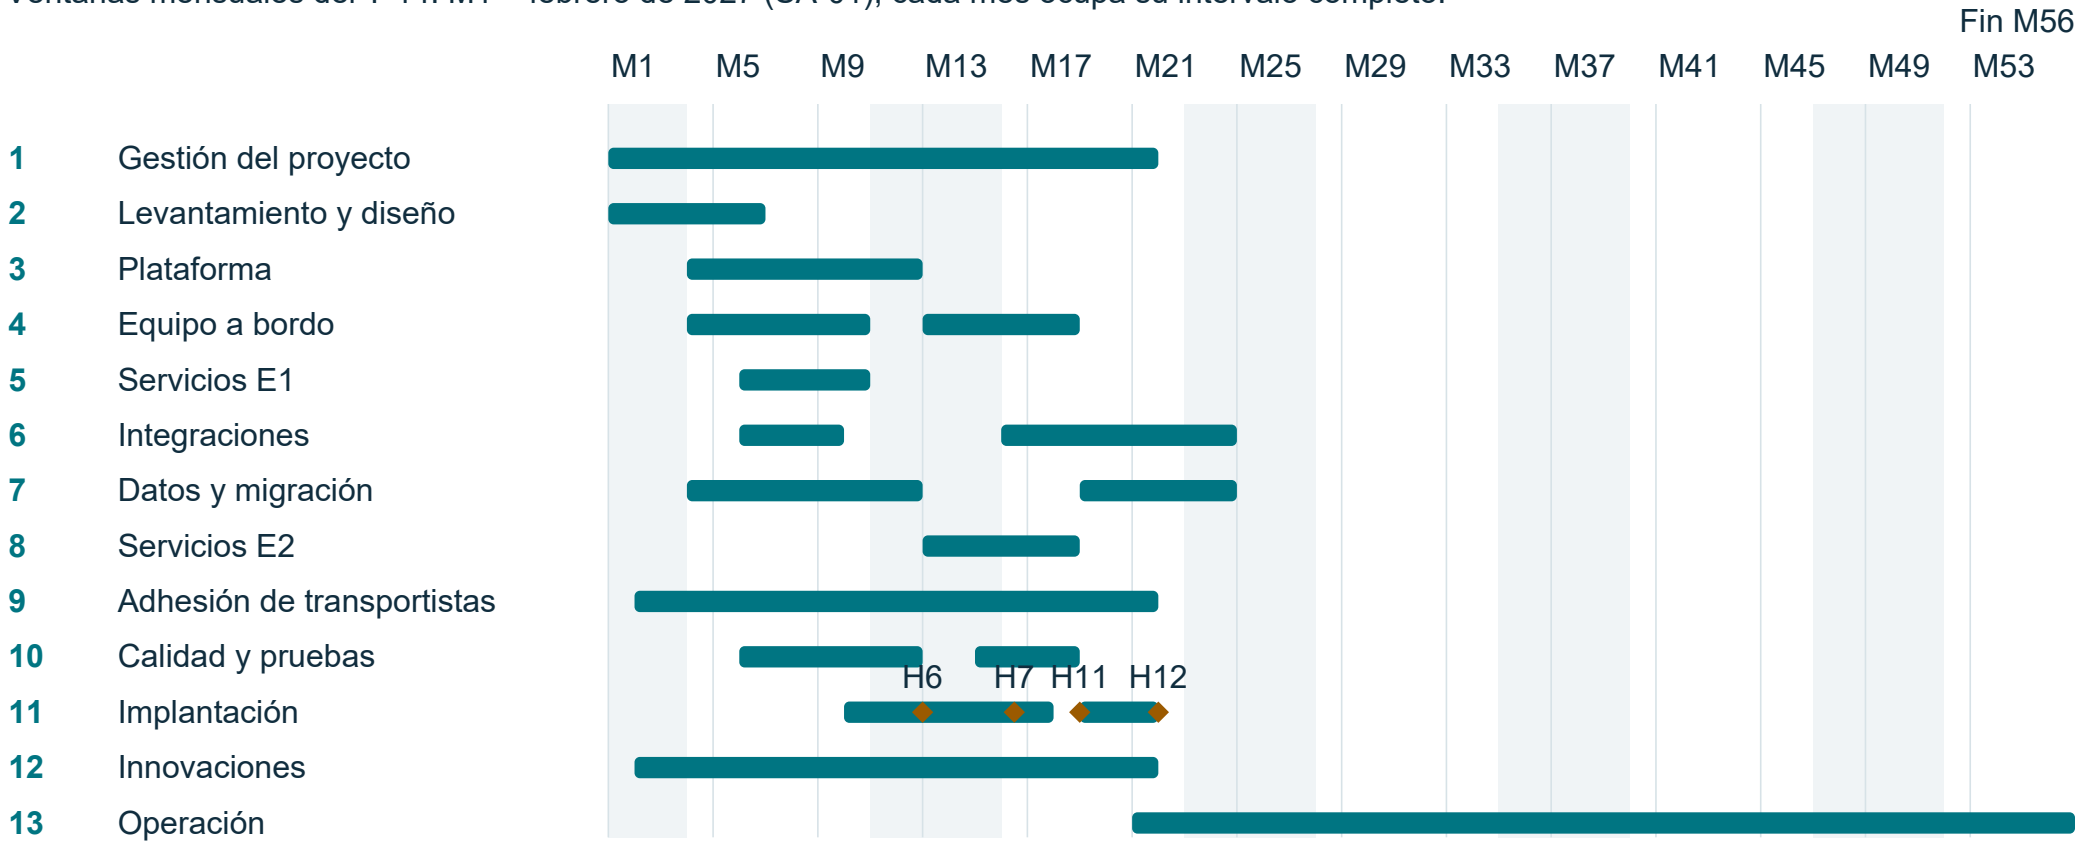


Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

audIT

Red CPM: ruta crítica y holguras

Línea base T-15 · 25 actividades + compuerta G13 · HT: holgura total en días hábiles.

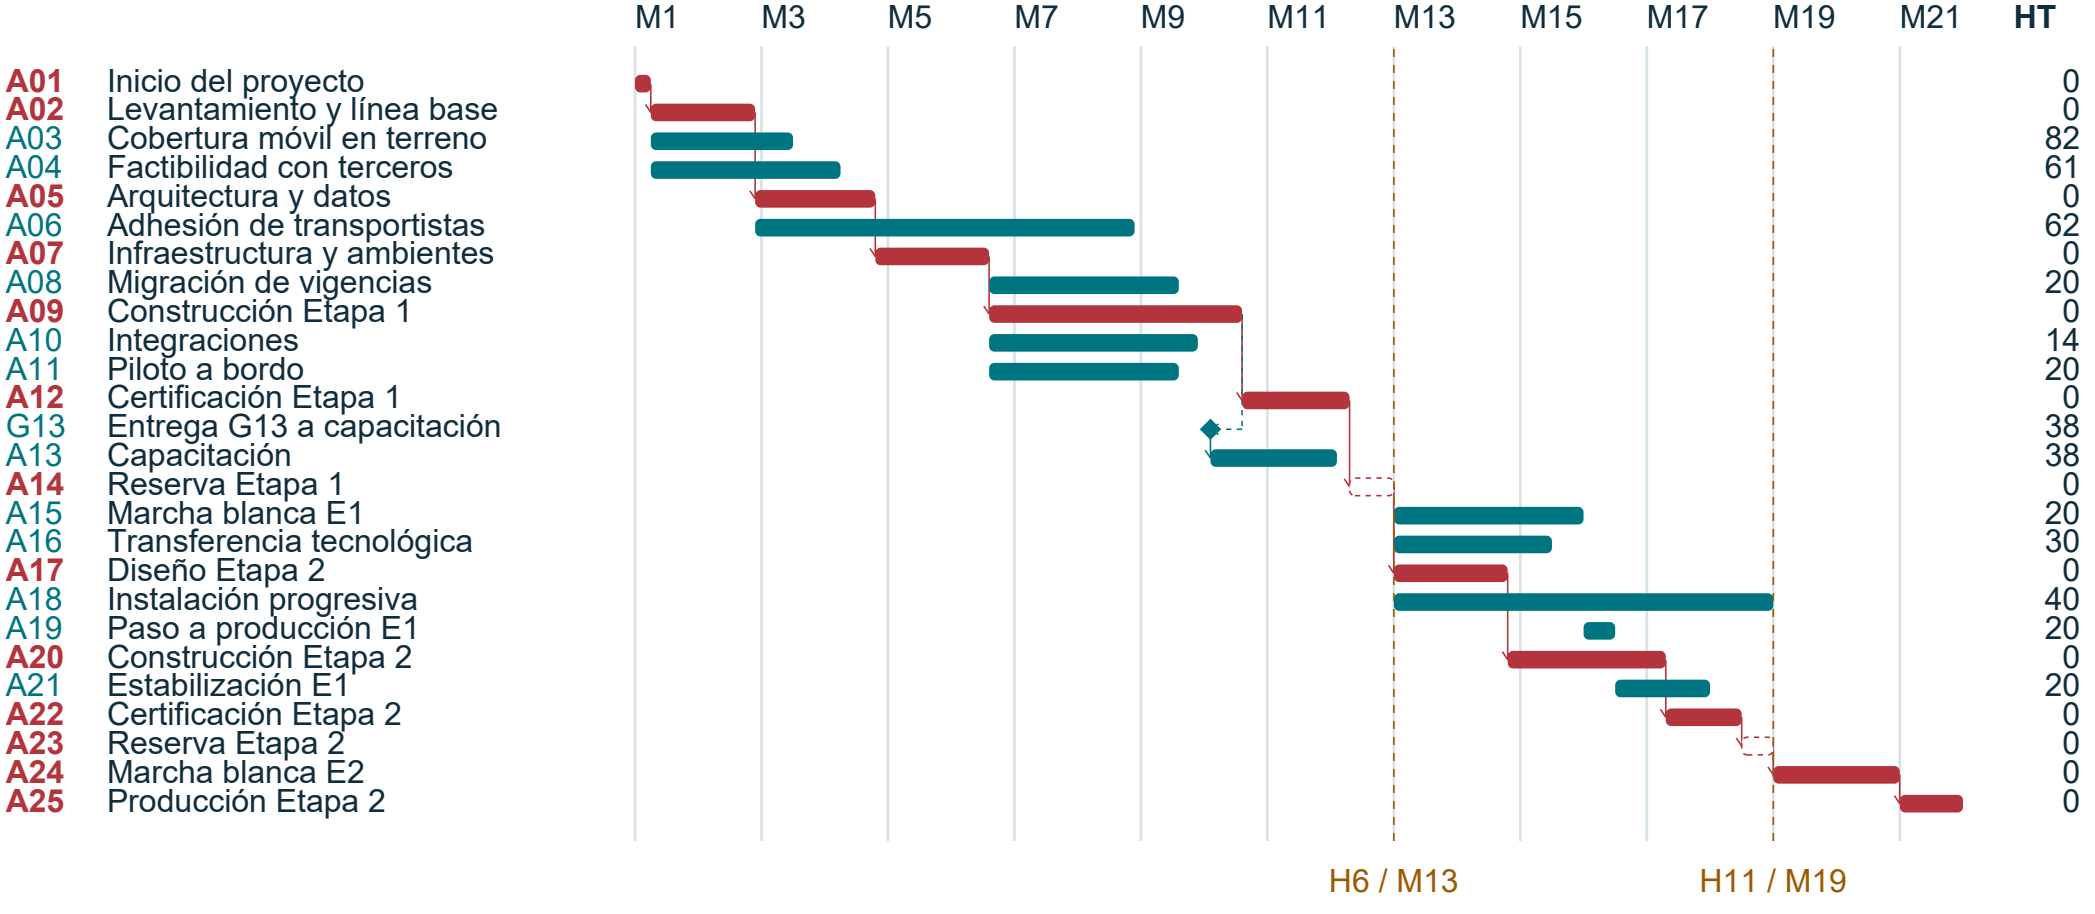


Rojo: ruta crítica y enlaces críticos · Turquesa: no crítica · Reserva: discontinua · FS-10: adelanto G13/A13. Fin M21 = día 420. Resto de precedencias: PERT y T-15.

audIT

Gestión y levantamiento

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

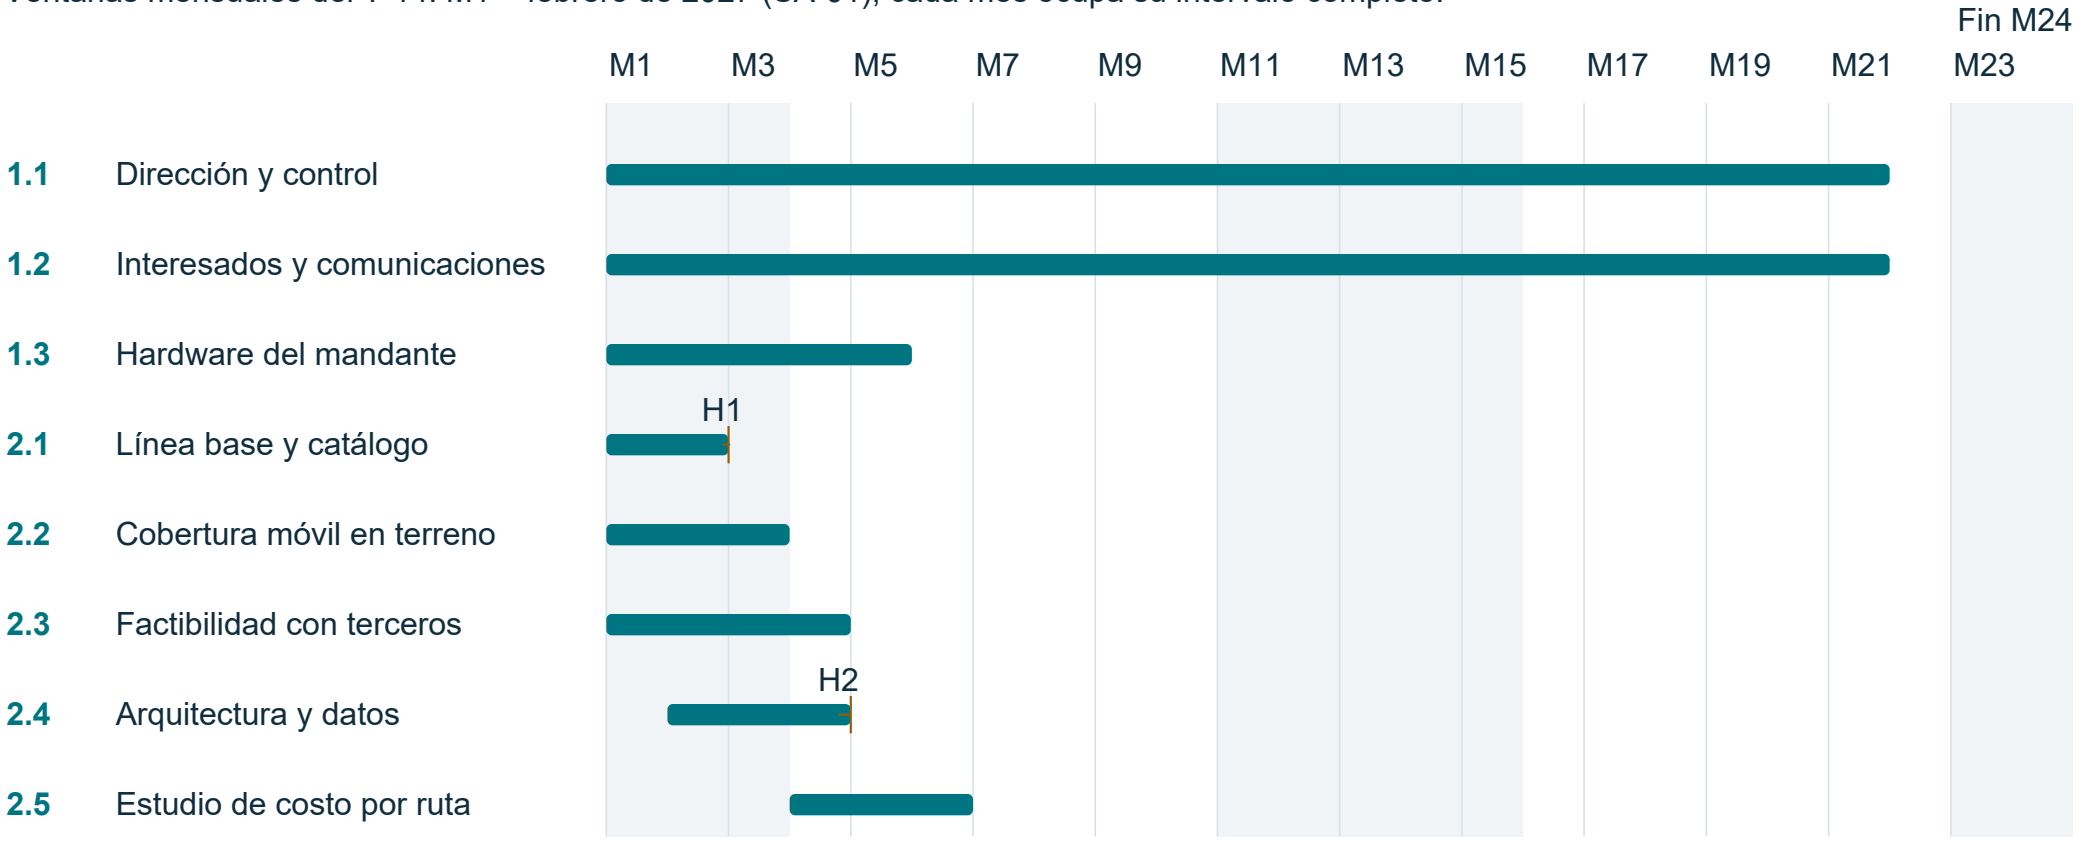

Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

audIT

Plataforma y equipo a bordo

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.




Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

audIT

Construcción de la Etapa 1

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

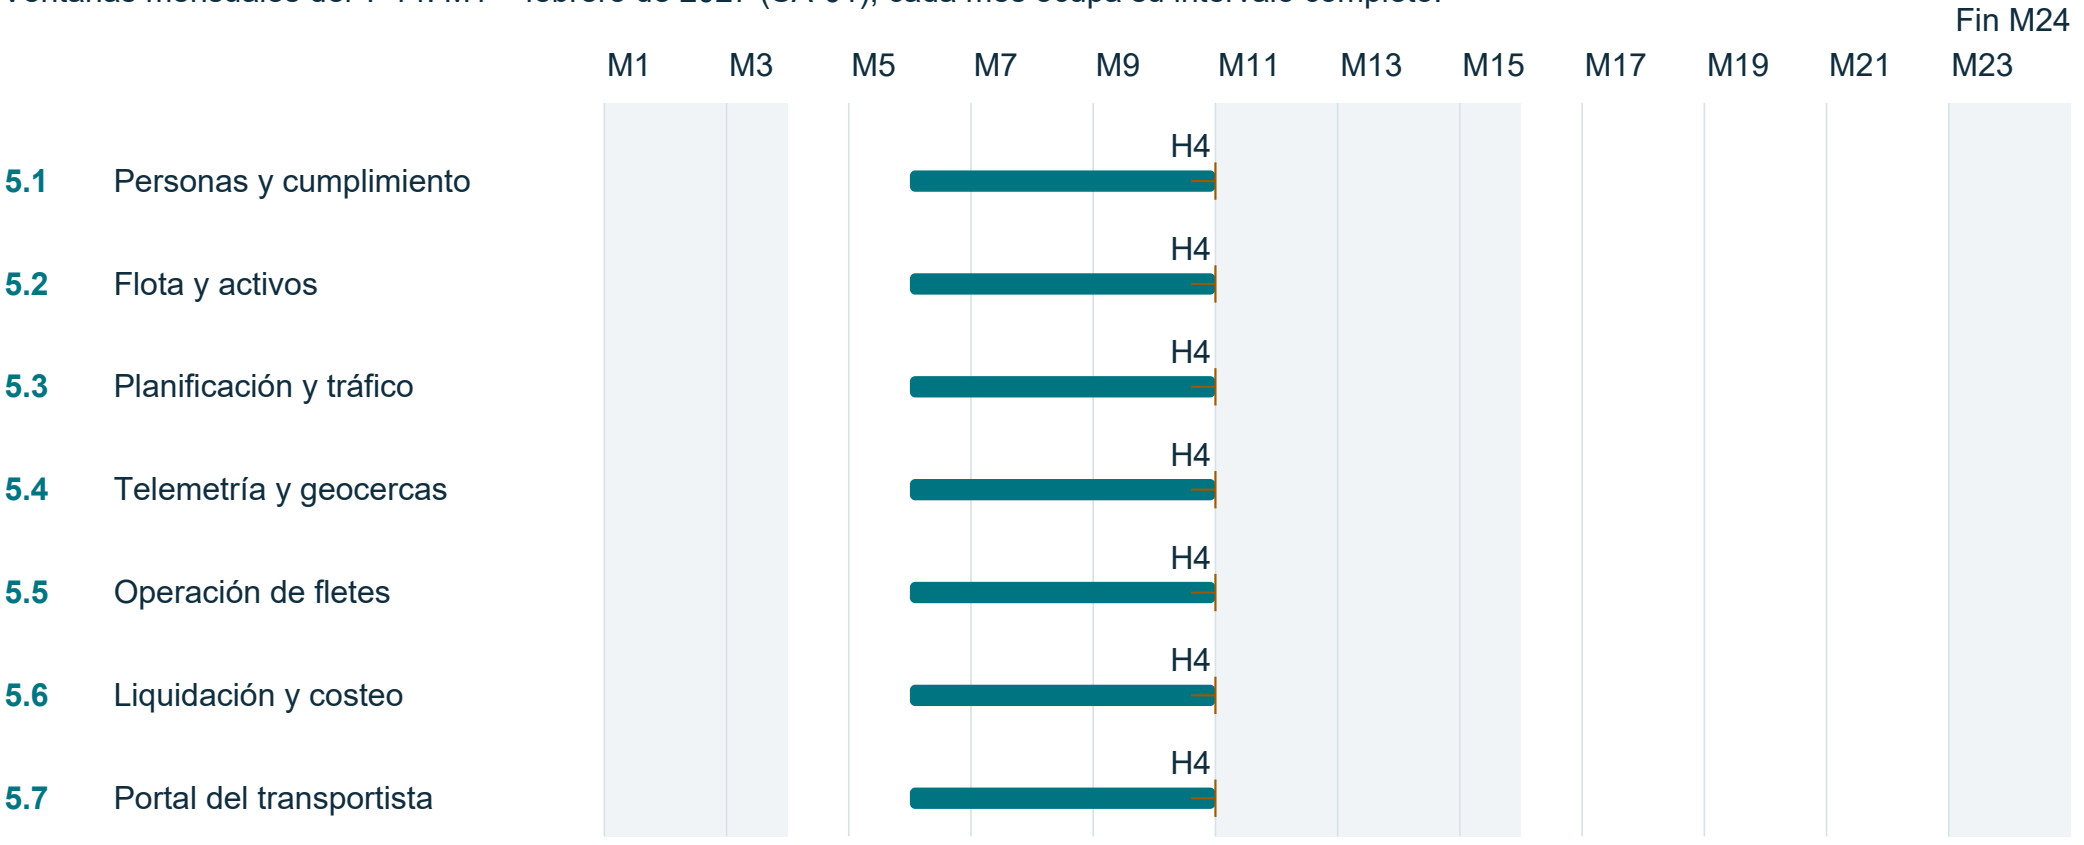


Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

audIT

Integraciones y migración

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

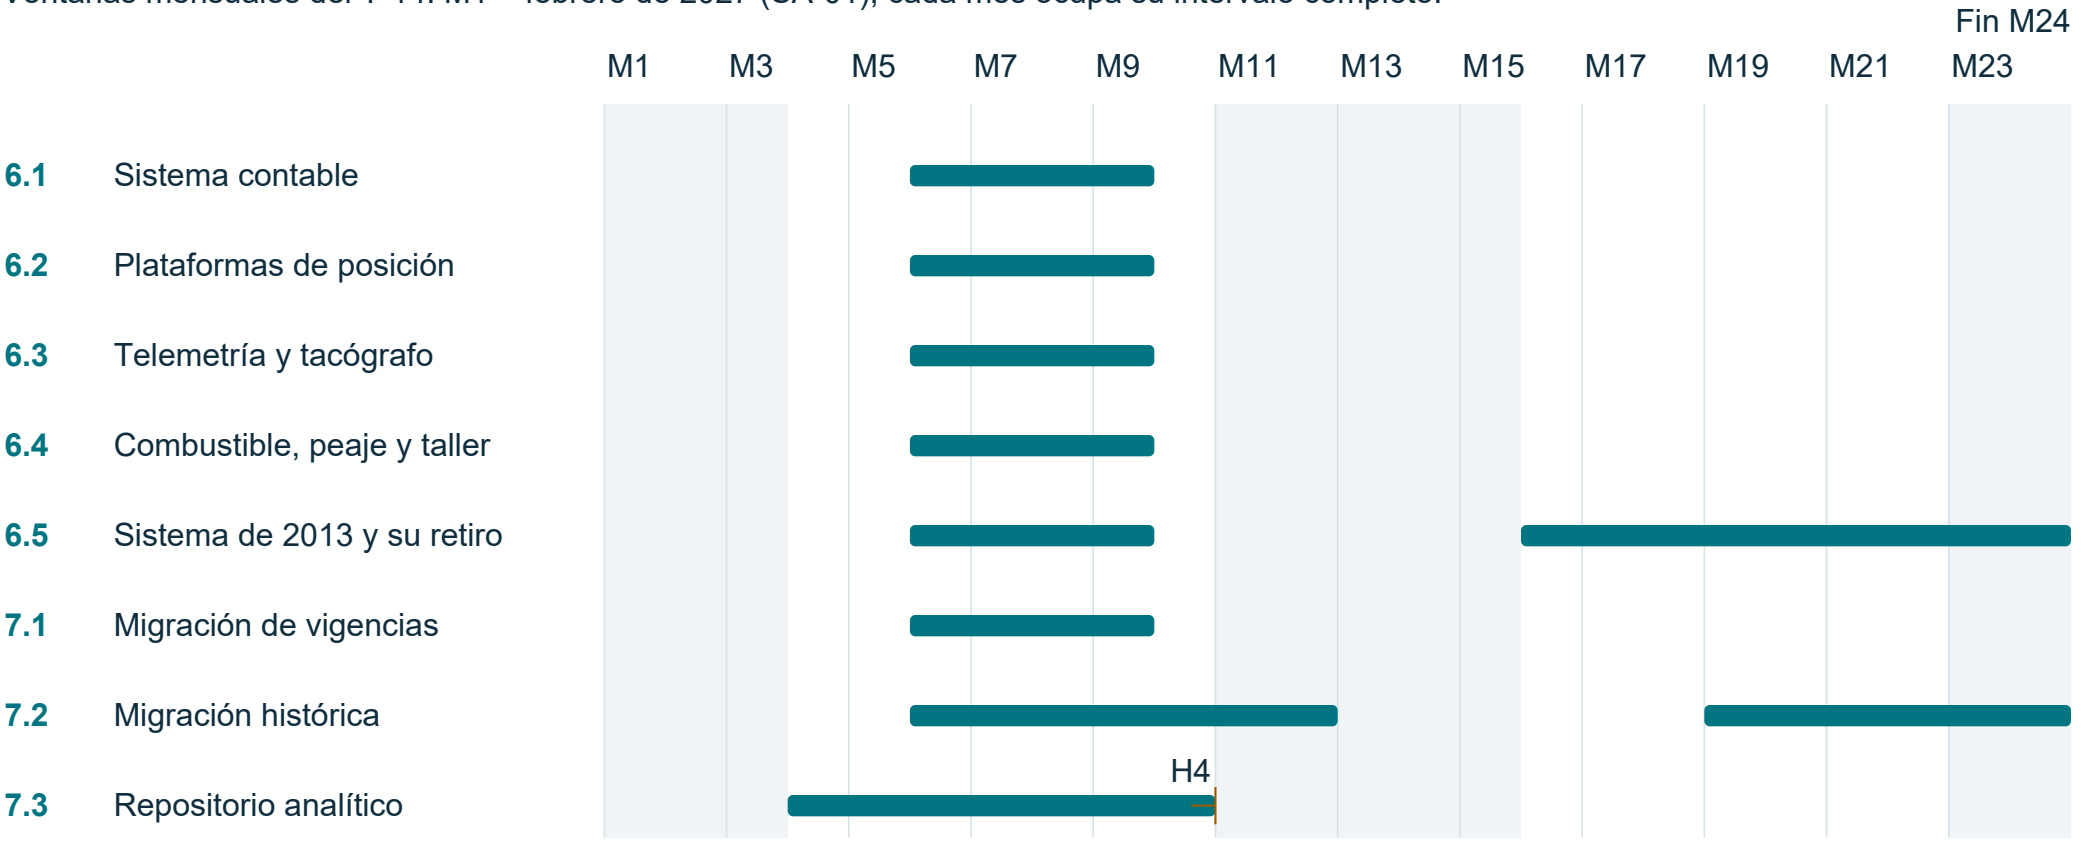


Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

audIT

Etapa 2 y adhesión

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

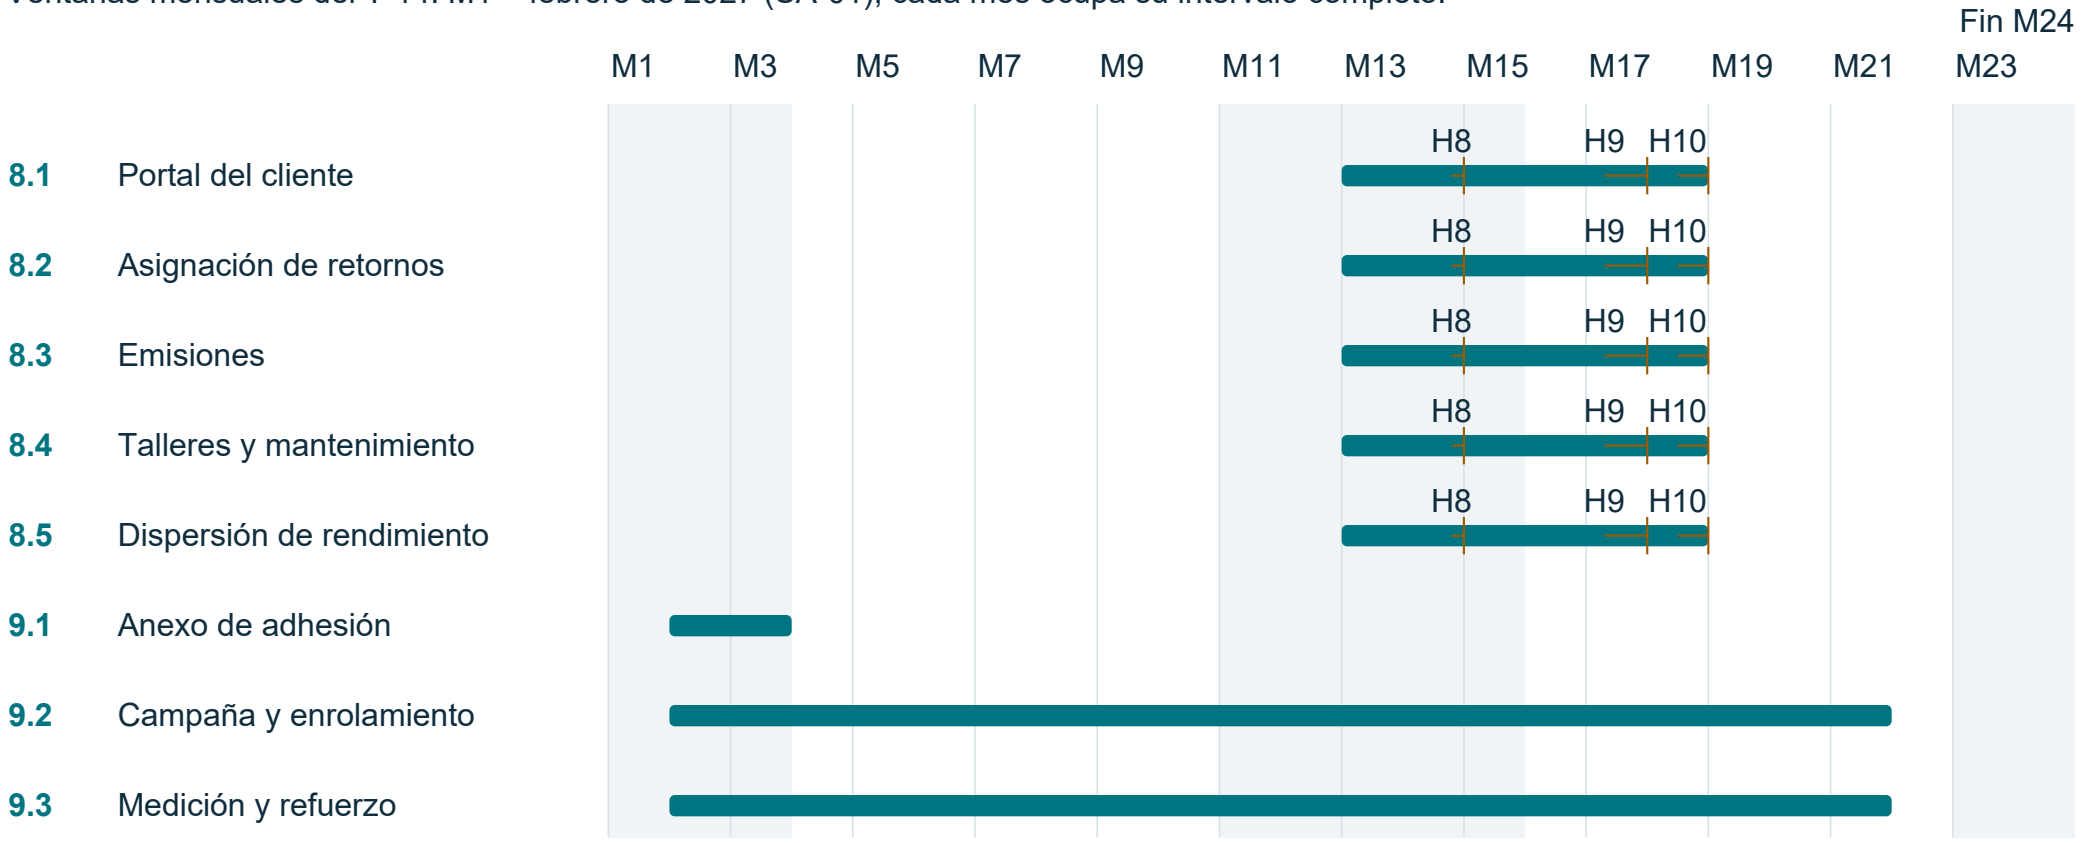


Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

audIT

Calidad, capacitación e implantación

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

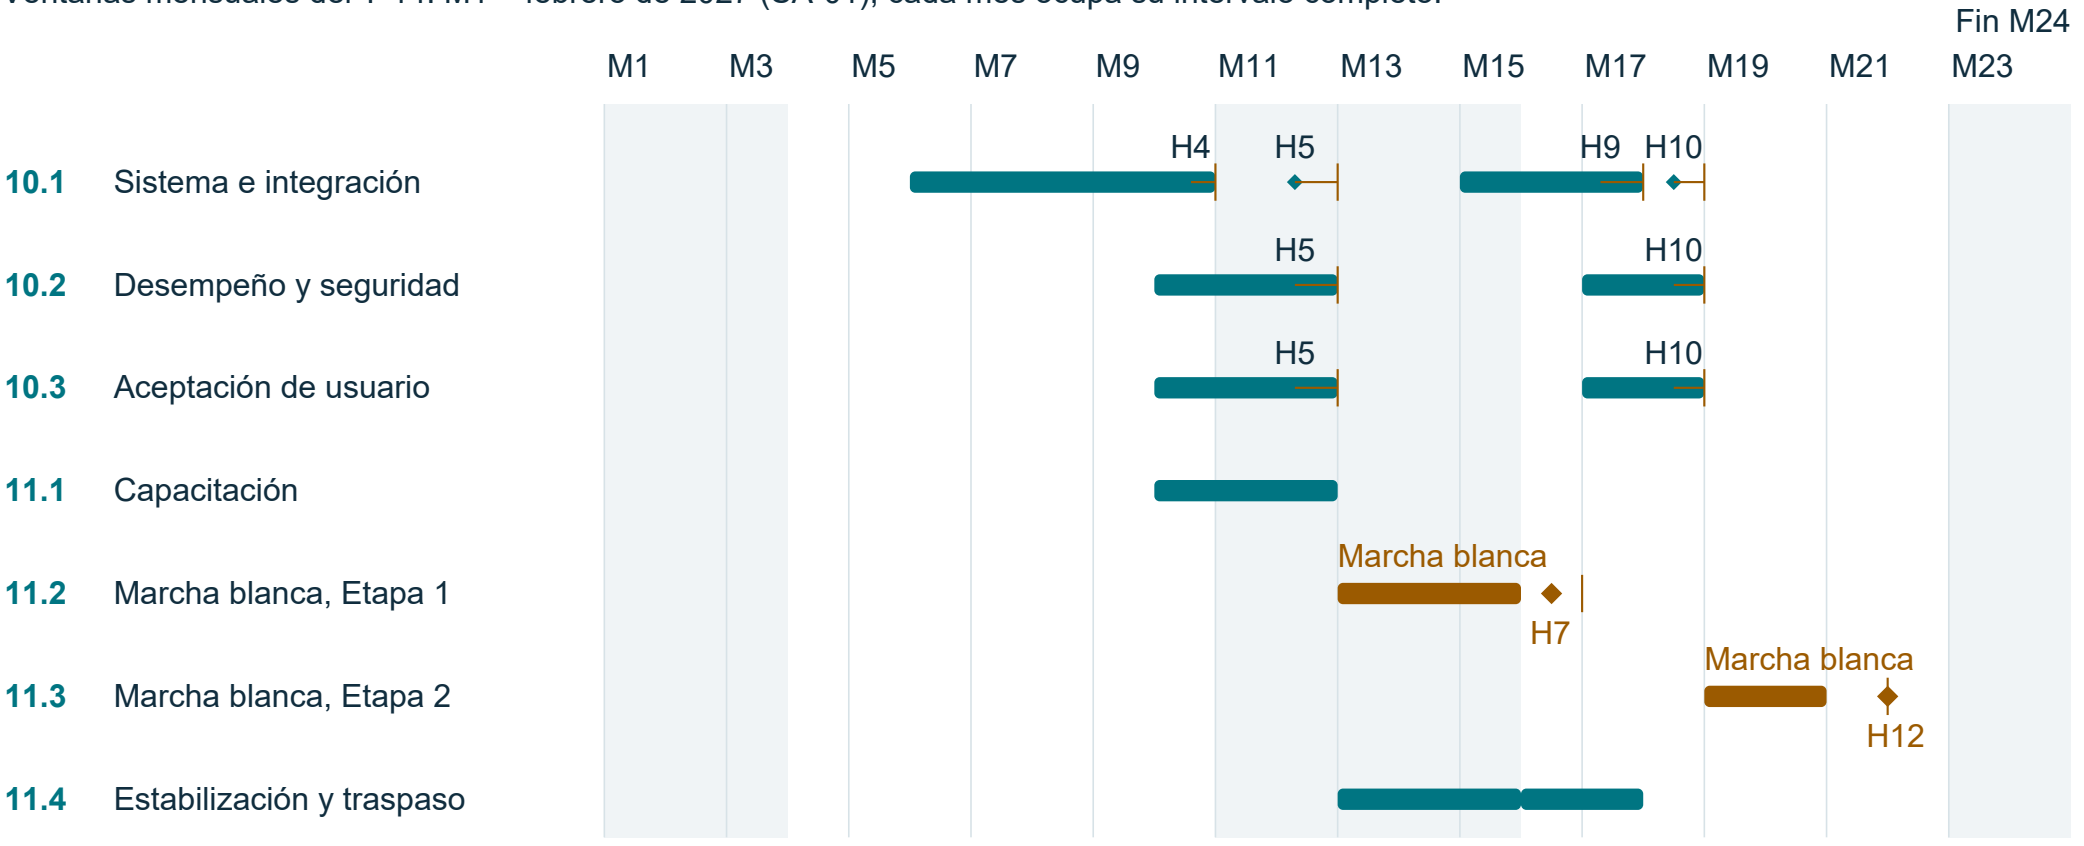


Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

Ventanas de las innovaciones

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

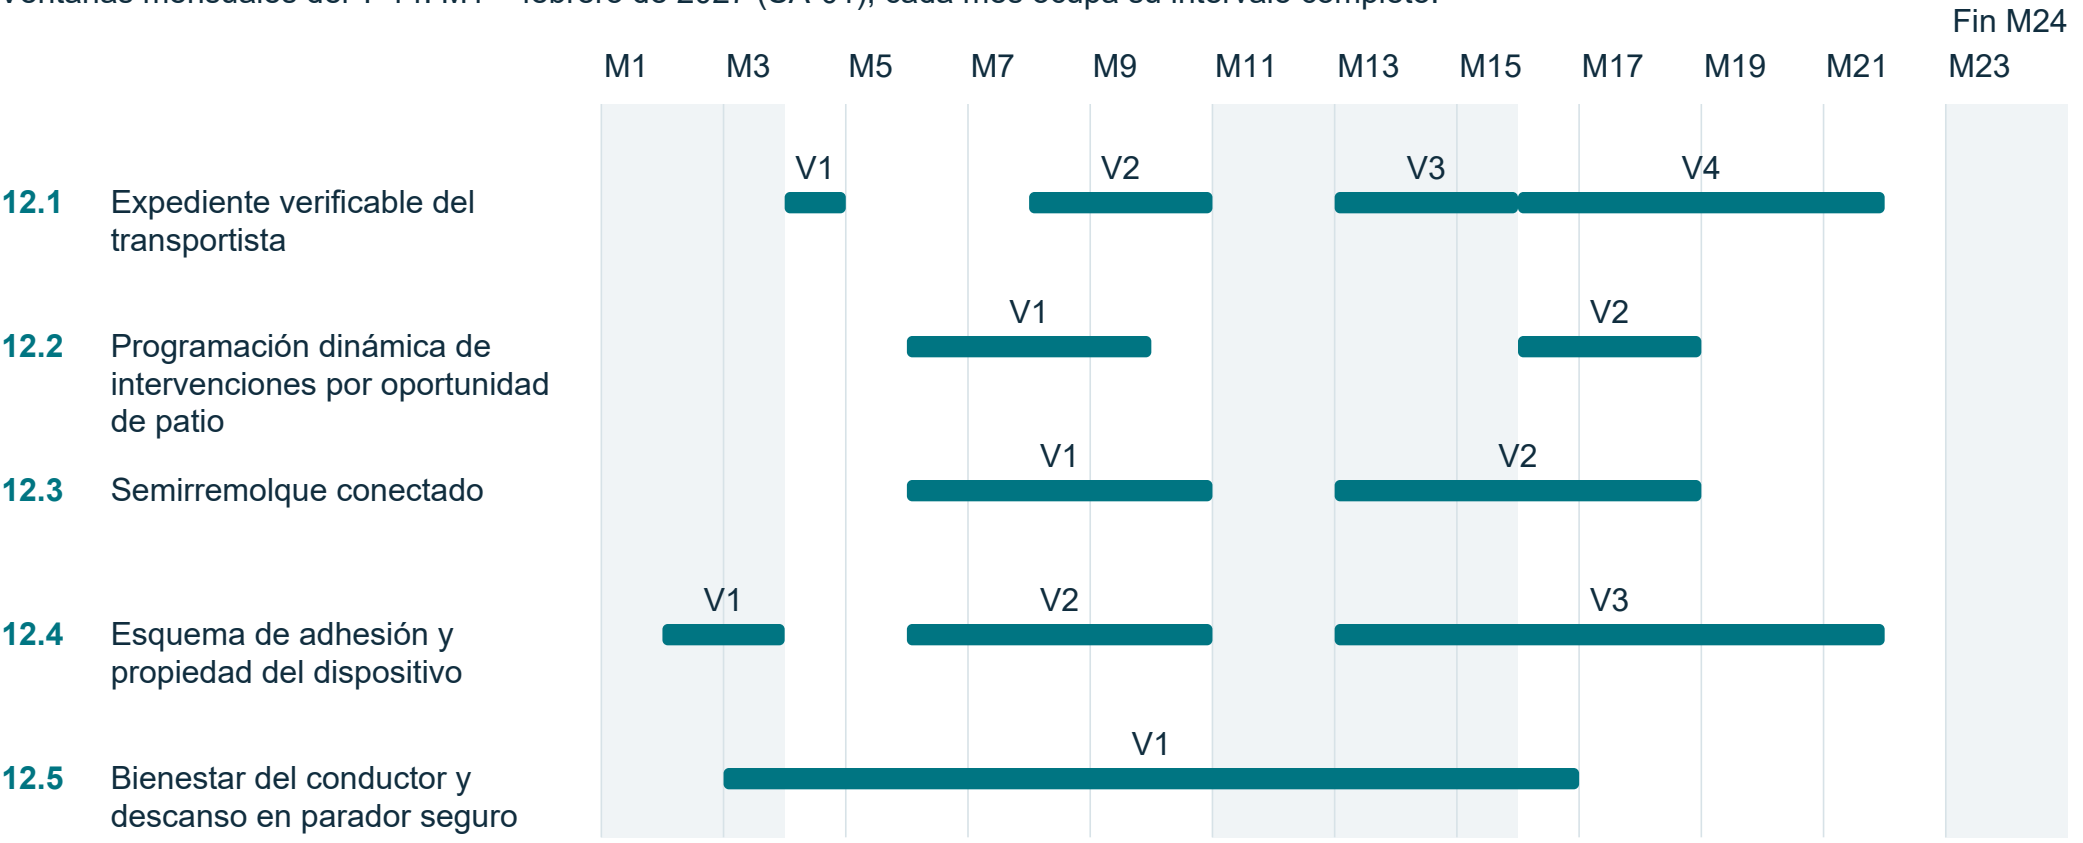

Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

V1, V2, V3 numeran ventanas previstas; los intervalos sin barra no acreditan una suspensión aprobada.

Hitos: planificación y compromiso

Días hábiles desde el inicio. Rombo = posición planificada; límite = fecha contractual, con H6/H11 como inicios fijos.

Hito	Nombre	Actividad	Plan	Límite	Mes	Margen
H1	Línea base de alcance	A02	38	40	Fin M2	2 d
H2	Arquitectura, seguridad y datos	A05	76	80	Fin M4	4 d
H3	Ambientes habilitados	A07	112	120	Fin M6	8 d
H4	Etapa 1 para pruebas	A09	192	200	Fin M10	8 d
H5	Certificación E1	A12	226	240	Fin M12	14 d
H6	Inicio marcha blanca E1	A15	240	240	Inicio M13	Fijo
H8	Línea base E2	A17	276	280	Fin M14	4 d
H7	Producción E1	A19	310	320	Fin M16	10 d
H9	Etapa 2 para pruebas	A20	326	340	Fin M17	14 d
H10	Certificación E2	A22	350	360	Fin M18	10 d
H11	Inicio marcha blanca E2	A24	360	360	Inicio M19	Fijo
H12	Aceptación final E2	A25	420	420	Fin M21	0 d

El margen del hito es límite menos fecha planificada; no equivale a la HT de la actividad. H12 tiene margen cero en la línea base con A23 incluida.

Fuente: tabla de hitos de S7, malla T-15 y catálogo económico del proyecto basado en E-25. H6 y H11 se fijan al inicio del mes.

Compuertas y reservas del cronograma

El calendario por sí solo no acredita la disponibilidad de G13 ni el cumplimiento de una aceptación.

G13 habilita A13

Día 182: entrega probada y congelada en PREPROD, datos ficticios y material por perfil. A13 conserva 40 días: 10 de familiarización y 30 de práctica/evaluación. El adelanto A09 FS-10 exige disponibilidad real de G13.

A14 protege el inicio de E1

Reserva explícita: 14 días, del 226 al 240. H6 fija el inicio de marcha blanca al día 240, comienzo de M13. Consumir la reserva exige registrar el cambio; no desplaza esa fecha fija.

A23 protege el inicio de E2

Reserva explícita: 10 días, del 350 al 360. H11 fija el inicio de marcha blanca al día 360, comienzo de M19. La reserva forma parte de la línea base CPM.


Holgura, margen y probabilidad

La HT mide flexibilidad de una actividad en la red; el margen de un hito se mide contra su límite contractual. La probabilidad de cumplir un límite se analiza en S8 y no se deduce del color o la longitud de una barra.

Fuente: S7, T-15 y T-18. Reservas e hitos se muestran en la línea base; esta lámina no introduce un escenario de atraso.

Continuidad operacional M21-M56

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.

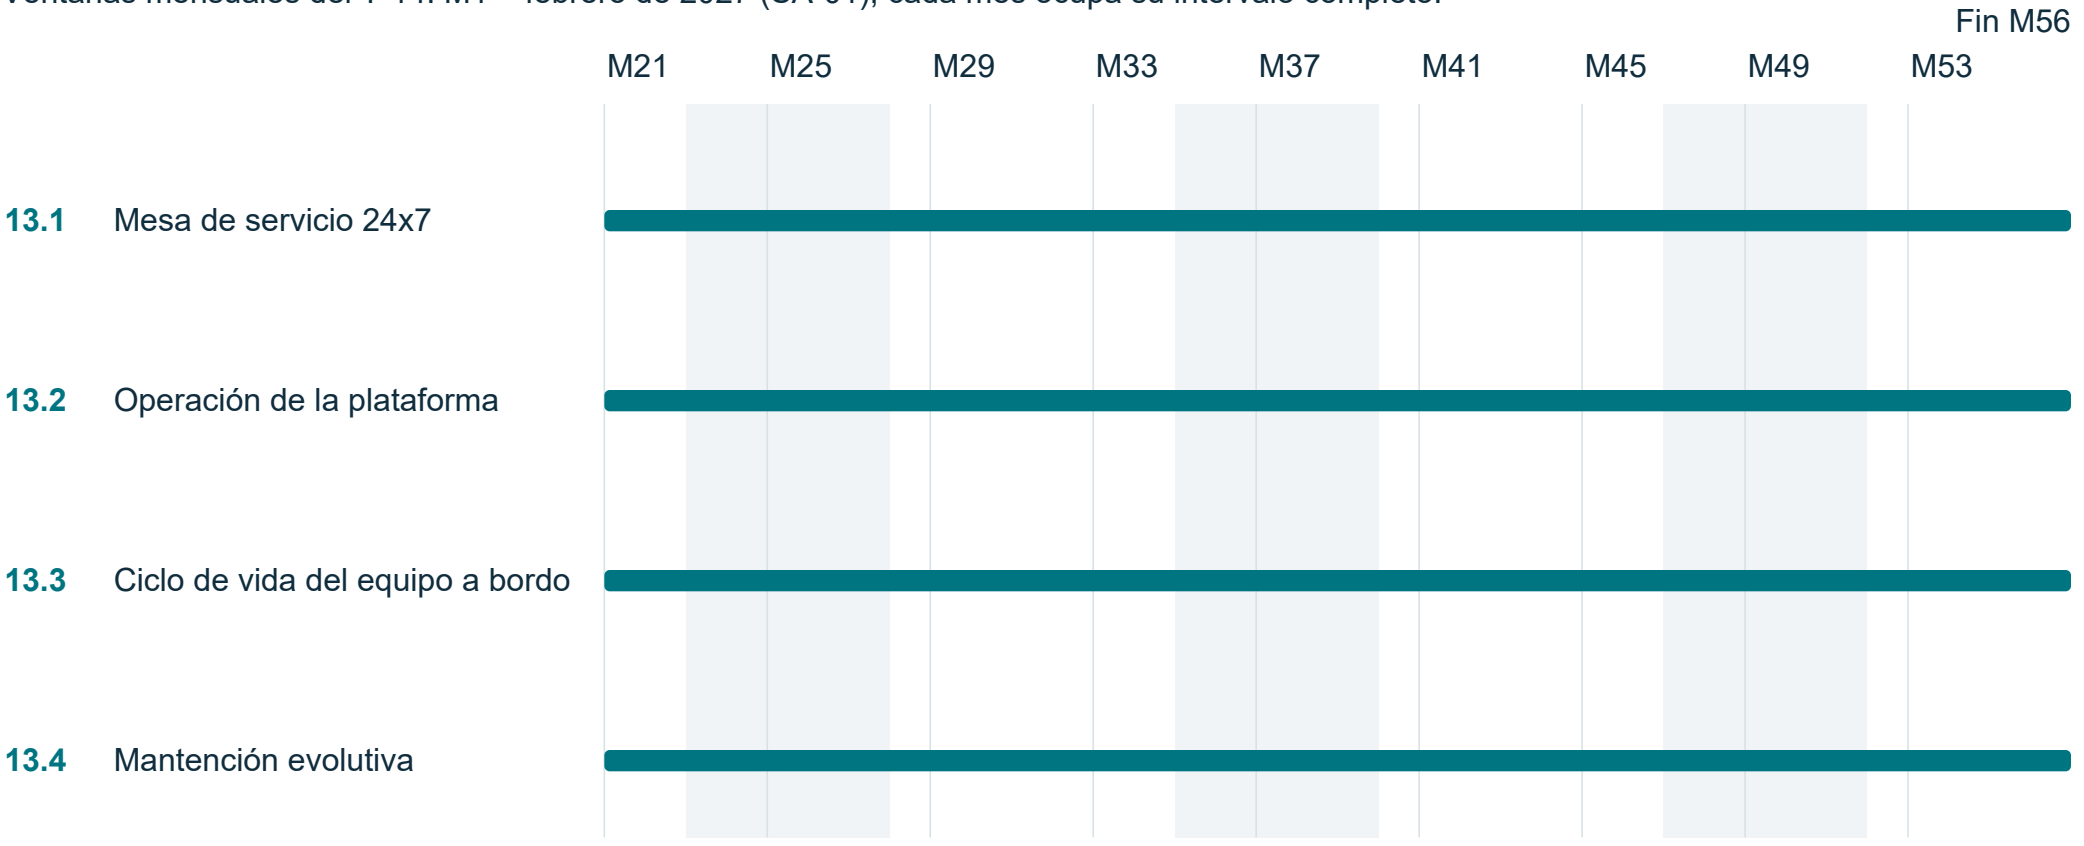

Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

36 meses de operación, M21-M56. El inicio de M21 es el día 400; H12 se planifica al fin de M21, día 420.
