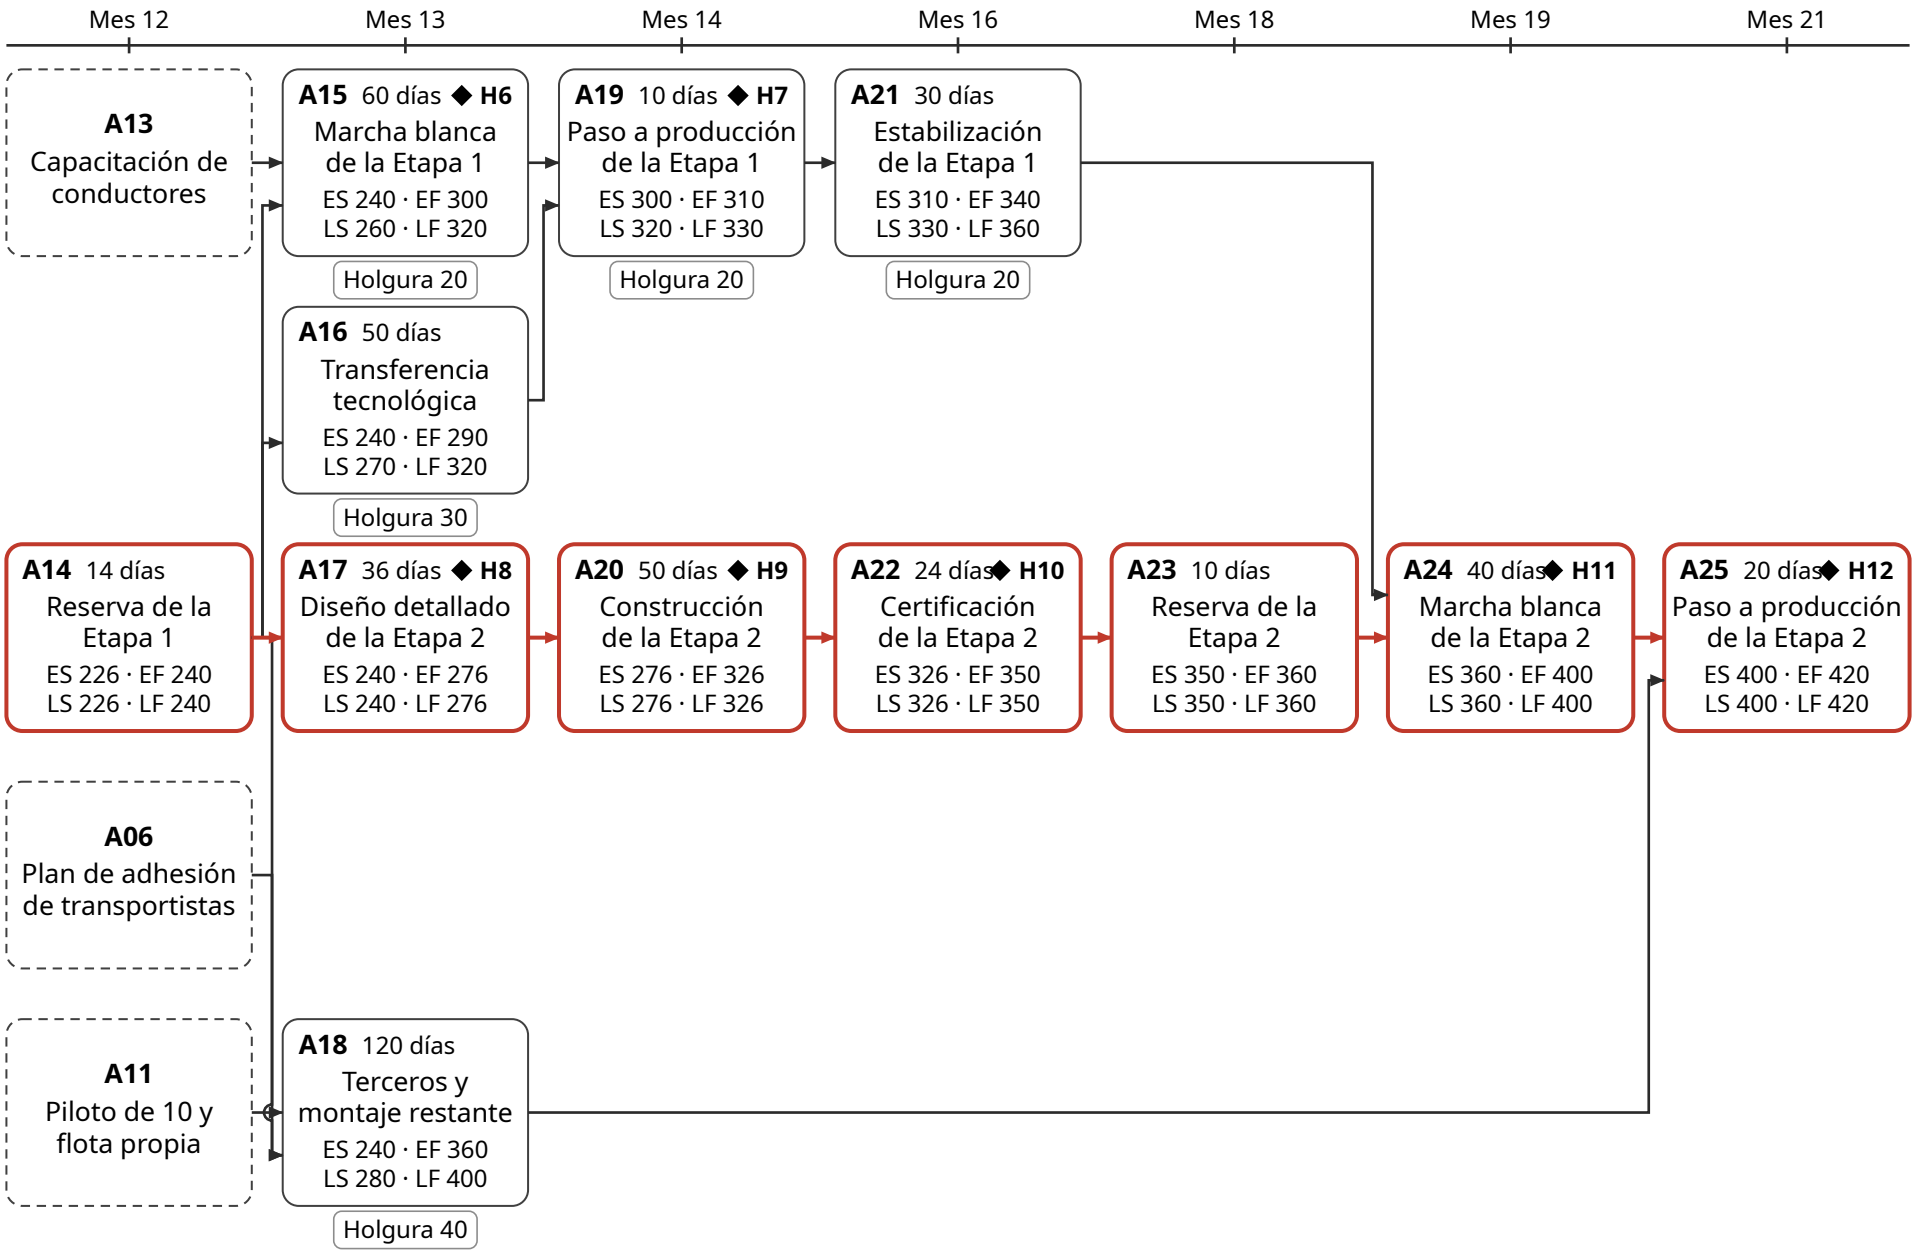
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 16
Mes 18
Mes 19
Mes 21
A13
Capacitación de conductores
A15 60 días ◆ H6
Marcha blanca de la Etapa 1
ES 240 · EF 300
LS 260 · LF 320
Holgura 20
A19 10 días ◆ H7
Paso a producción de la Etapa 1
ES 300 · EF 310
LS 320 · LF 330
Holgura 20
A21 30 días
Estabilización de la Etapa 1
ES 310 · EF 340
LS 330 · LF 360
Holgura 20
A16 50 días
Transferencia tecnológica
ES 240 · EF 290
LS 270 · LF 320
Holgura 30
A14 14 días
Reserva de la Etapa 1
ES 226 · EF 240
LS 226 · LF 240
A17 36 días ◆ H8
Diseño detallado de la Etapa 2
ES 240 · EF 276
LS 240 · LF 276
A20 50 días ◆ H9
Construcción de la Etapa 2
ES 276 · EF 326
LS 276 · LF 326
A22 24 días ◆ H10
Certificación de la Etapa 2
ES 326 · EF 350
LS 326 · LF 350
A23 10 días
Reserva de la Etapa 2
ES 350 · EF 360
LS 350 · LF 360
A24 40 días ◆ H11
Marcha blanca de la Etapa 2
ES 360 · EF 400
LS 360 · LF 400
A25 20 días ◆ H12
Paso a producción de la Etapa 2
ES 400 · EF 420
LS 400 · LF 420
A06
Plan de adhesión de transportistas
A11
Piloto de 10 y flota propia
A18 120 días
Terceros y montaje restante
ES 240 · EF 360
LS 280 · LF 400
Holgura 40
