audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 2

Resumen ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 2. Resumen ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad
Contenido	Resumen ejecutivo de la propuesta y comprensión del problema, del contexto, de los actores y de los supuestos.
Formularios	El Formulario T-21 no asigna formularios a este subdocumento
Archivo	`AUDIT-Subdocumento2.pdf`
Folios	Del 1 al 34, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 2

Índice

Resolución de observaciones 5

2 Introducción al Problema y Necesidad 8

2.1 Resumen Ejecutivo del problema 8

2.2 Comprensión del problema y de la necesidad 10

2.2.1 Diagnóstico e interpretación causal de la cadena operacional 13

2.2.2 Fundamentación de la investigación externa aportada y marco normativo 14

2.2.3 Calendario operacional, estacionalidad y modelamiento de demanda 16

2.3 Dimensionamiento del problema 19

2.3.1 Análisis de los 7 bloques de datos duros de Curimón 21

2.3.2 Caracterización territorial y mapeo de nodos críticos 23

2.4 Actores y Grupos de Interés 24

2.4.1 Principios de arbitraje de las seis tensiones operacionales 25

2.5 Resumen de Requerimientos, Supuestos, Exclusiones y Restricciones 26

2.5.1 Síntesis de requerimientos del negocio y operacionales preliminares 27

2.5.2 Matriz de supuestos de ingeniería de proyectos 28

2.5.3 Exclusiones y restricciones principales 30

Referencias 32

Declaración de uso de IA 33

FIGURAS

2.1 Flujo operacional y cadena de valor del transporte de carga en Curimón 11

2.2 Calendario operacional y restricciones de despliegue 16

2.3 Relaciones operacionales entre registros, decisiones e impactos 20

2.4 Poder efectivo e interés operativo de los 13 actores de Curimón 24

TABLAS

2.1 Volumetría operacional y magnitudes del desafío logístico 19

2.2 Síntesis de nodos críticos de la red operacional 23

2.3 Matriz sintética de actores y grupos de interés 25

2.4 Matriz de supuestos clave de ingeniería de proyectos 28

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
14	El Subdocumento 2 cierra con una nota metatextual ajena al carácter pericial del documento.	**Se acepta.** La sección de cierre conserva el alcance, supuestos y remisión al anexo. El control editorial comprueba residuos de elaboración y distingue contenido de la oferta del registro de trabajo.	S2, sección 2.5 y Anexos 2.C/2.E.
24	No existe resumen ejecutivo de la propuesta; la sección 1.1 resume exclusivamente el problema.	**Se acepta y se aclara.** El título literal del Comunicado 10 es Resumen Ejecutivo del problema; S2 desarrolla problema, escala y actores, conectando el diagnóstico con capítulos de solución sin reemplazar el análisis por su diseño.	S2, sección 2.1; Comunicado 10, capítulo 2.
25	Bloques 1.2.1 a 1.2.7 como títulos y tablas aisladas con prosa que repite adjetivos sin análisis de fondo.	**Se acepta.** S2 organiza la explicación mediante flujo general y análisis de sus etapas, seguido de dimensionamiento y actores. Las magnitudes corregidas se distinguen de hipótesis y causalidad interpretada.	S2, secciones 2.2 y 2.3.
26	Lenguaje inflado: ”riesgo de magnitudes incalculables”, ”hemorragia financiera”, ”desgobierno”.	**Se acepta.** El diagnóstico diferencia datos observados y relaciones interpretadas por audIT. Se corrigen denominadores, testimonios sin fuente y atribuciones agregadas de causalidad; el control editorial completa la comprobación de tono.	S2 2.1–2.5; explicación de cadena operacional.
27	Nota metodológica de blindaje económico inserta en el cuerpo técnico (pág. 11).	**Se acepta.** La restricción económica se limita al alcance contractual y no se presenta como una instrucción al revisor. Su aplicación se comprueba mediante control editorial sobre fuente y salida.	S2, cierre de sección 2.5; control editorial.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
28	No hay un solo dato investigado fuera del caso; la bibliografía los lista pero el texto no los utiliza.	**Se aclara.** S2 utiliza las fuentes externas en afirmaciones concretas y las relaciona con sus restricciones de diseño. La Resolución Exenta N.º 1213 de la Dirección del Trabajo se cita con fecha y referencia bibliográfica para distinguir registros técnicos de tacógrafo y control laboral de jornada. La exposición GLEC/ISO 14083 admite factores modelados para tramos sin telemetría primaria y prioriza mediciones, sin prohibición absoluta de estimaciones.	S2 §2.2.2 y Referencias; Dirección del Trabajo, Resolución Exenta N.º 1213, 8 de octubre de 2009.
29	La estacionalidad operativa se menciona pero no se cuantifica su efecto sobre jornada, sobreestadía ni cobertura.	**Se acepta.** S2 conserva el balance de 96.000 viajes/año con 151 días de temporada alta y 214 de valle. Los 210 viajes/día en valle constituyen una hipótesis explícita: la media alta resultante es 338,15. La sensibilidad exacta de más/menos 15 por ciento utiliza 178,5 y 241,5 en valle y produce 382,79 y 293,50 en alta. La cota de 450 viajes/día es preliminar y se calibra en H1. Se separan viajes diarios y sesiones concurrentes, cierres viales y pérdida de cobertura.	S2 §2.2.3, ecuación 2.1 y Figura 2.2; T-13 y T-17 CP-PERF-01.
30	El marco normativo aparece como citas sueltas sin explicitar la obligación de control que impone cada norma.	**Se acepta.** El marco relaciona jornada, habilitaciones, documentos y controles de despacho. S9/T-17 operacionalizan mínimos, captura automática en marcha, actuación detenido, jornada previa de terceros y revocación con conservación obligatoria.	S2, restricciones; S9, mínimos trazados; T-17.
31	Faltan como actores el Fondo de Inversión (22 % de la propiedad), la autoridad laboral (DT) y la aseguradora de carga.	**Se acepta.** La matriz y las trece fichas incluyen Fondo de Inversión, Dirección del Trabajo y aseguradora. La posición refleja poder efectivo; transportistas, conductores, TI y mantenimiento no se reducen a bajo poder jerárquico.	S2 2.4 y Anexo 2.D; matriz de actores.
32	Las tensiones de gobernanza se enumeran pero no se arbitran técnicamente.	**Se acepta.** Se desarrollan criterios de arbitraje de las tensiones en 2.4.1; los bloqueos de jornada, habilitación y conformidad documental prevalecen sobre una excepción comercial.	S2 2.4.1; T-17 CP-SYS-18.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
33	Los 26 supuestos presentados son copia de las 26 decisiones del numeral 16.1 del pliego, no supuestos propios.	**Se acepta.** El Anexo 2.E distingue las 26 decisiones del Caso de los seis supuestos de S2. La validación de permisos, cobertura y condiciones de integración no se confunde con hechos ya acreditados. S9/T-17 utilizan modalidades y niveles de S3; la correspondencia del modelo de S5 debe alinearse con ese contrato antes de aceptar la integración.	S2 §2.5.2 y Anexo 2.E; S3/T-12; S9 §9.1.1; T-17 CP-SYS-05 y CP-UAT-09.
34	No se declaran los supuestos propios de la propuesta técnica ni el impacto en caso de resultar falsos.	**Se acepta.** Los supuestos propios identifican fundamento, impacto y verificación; el perfil de carga es una hipótesis, no un registro histórico. El dimensionamiento de memoria y reconexión conserva frecuencias, bytes, overhead y reserva explícitos.	S2 2.5.2; S4 dimensionamiento; T-17 CP-PERF-02/CP-HW-03.
35	El cierre de la sección 1.6.3 contiene una nota metatextual ajena al carácter pericial de la propuesta.	**Se acepta.** El cierre de S2 se limita a requerimientos, restricciones y remisiones del documento; los pendientes de integración se mantienen en el registro de trabajo. La comprobación editorial de la salida completa este control.	S2 2.5 y anexos técnicos.
36	Tono de paper académico y una sola figura en 32 páginas de documento.	**Se acepta.** S2 integra flujo, calendario, relaciones operacionales y matriz de actores con análisis. Se corrigen cifras y se califica interpretación causal; la revisión de legibilidad se realiza en la salida actual.	S2, figuras de 2.2/2.3/2.4.

2

SUBDOCUMENTO N.º 2. RESUMEN EJECUTIVO, COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y DE LA NECESIDAD

Introducción al Problema y Necesidad

RESUMEN DE APERTURA

audIT analiza la situación operacional de Transportes Curimón S.A. para la licitación TFEP-01/2026. El capítulo presenta el contexto logístico, la escala del problema, los trece grupos de interés y las necesidades, supuestos y restricciones que condicionan el alcance. Distingue los datos de las bases de los cálculos e hipótesis del proponente: la punta preliminar de 450 viajes diarios requiere validación, y los cierres viales de hasta doce días no demuestran una interrupción de conectividad de igual duración.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Análisis de la cadena de valor en seis fases y de las brechas operacionales del Caso 10.
- Caracterización de la temporada frutícola (diciembre a abril) y los cierres fronterizos de hasta doce días, diferenciados de la autonomía sin cobertura.
- Mapeo estratégico de poder e influencia sobre los 13 actores del ecosistema y criterios de arbitraje para las seis tensiones operacionales.
- Matriz de supuestos de ingeniería con evidencia disponible, impacto y condiciones de validación.
- Cinco anexos de soporte: catálogo de 25 necesidades preliminares, inventario de 374 tractocamiones y 454 conductores, restricciones y exclusiones, trece fichas de actores y condicionantes de las 26 decisiones de diseño del caso.

El diagnóstico fundamenta el alcance de S3 y su matriz T-12, el dimensionamiento y continuidad de S4 y los dominios de información de S5. También aporta las condiciones operacionales para metodología, planificación, riesgos, calidad y servicios de S6 a S11, y para organización, innovaciones y beneficios de S12 a S14. Los inventarios y listados de soporte se presentan en el documento independiente *AUDIT-Subdocumento2-Anexos.pdf*.

2.1 Resumen Ejecutivo del problema

El diagnóstico estructural de Transportes Curimón S.A. revela un desacople crítico entre la responsabilidad integral asumida por la compañía frente a sus mandantes y el control operacional efectivo que ejerce sobre los recursos con que ejecuta el servicio de transporte interurbano. En el modelo de negocio vigente, Curimón asume el 100 % de la responsabilidad patrimonial, civil y laboral por la carga transportada, la puntualidad en los puntos de destino, la seguridad de las operaciones en ruta y el cumplimiento normativo ante organismos fiscalizadores. No obstante, el 60,4 % de la capacidad de transporte rodante (226 tractocamiones de un total de 374) y el 56,8 % de la fuerza de conducción asignable (258 conductores externos frente a 196 propios) corresponden a recursos subcontratados pertenecientes a

148 pequeños y medianos transportistas independientes, sobre los cuales la empresa no ejerce tuición patronal ni subordinación directa.

Esta asimetría estructural genera vacíos sistemáticos de supervisión que impactan de manera directa la estabilidad operacional de la compañía. En el plano de la escala física, la red logística de Curimón coordina anualmente 96.000 viajes, movilizando 2,4 millones de toneladas de carga a lo largo de 41 millones de kilómetros recorridos por carretera. La operación se despliega en un eje territorial superior a 3.000 kilómetros lineales entre las ciudades de Antofagasta y Puerto Montt, complementado por aproximadamente 1.900 cruces internacionales por el Paso Fronterizo Los Libertadores hacia la provincia de Mendoza. La asignación se apoya en telefonía, planillas y la memoria de 22 despachadores de San Bernardo. Las bases registran que el 26 % de la distancia anual se recorre sin transportar carga: son kilómetros vacíos, por retorno o desplazamiento hacia otra recogida, y equivalen a 10,66 millones de kilómetros. La cifra no permite determinar cuántos camiones permanecen ociosos ni atribuir todos esos recorridos a una misma causa.

La fragilidad descrita se traslada con rigor a la estructura financiera y comercial de la compañía. Curimón registra la facturación anual bruta consolidada del mandante operando con un margen operacional estrecho del 9,0 %. Sin embargo, dicho margen global encubre una distorsión profunda: el análisis analítico de rentabilidad por contrato evidencia que tres (3) de los ocho (8) clientes principales de la empresa operan por debajo de la línea de costo técnico. Estos tres contratos deficitarios concentran en conjunto el 31 % de los ingresos corporativos, registrándose en el caso más grave un contrato con un margen negativo sostenido del -14 % durante cuatro ejercicios fiscales consecutivos. Esta pérdida ha sido financiada de forma involuntaria por las rutas rentables debido a la aplicación histórica de un esquema contable de prorrateo ciego de costos por ingresos.

La sobreestadía es la permanencia en carga o descarga que excede el tiempo libre acordado y puede generar un cobro adicional según el contrato; no toda espera es cobrable. El 71 % de los cobros facturados por este concepto resulta objetado por los clientes. La falta de registros objetivos de llegada, espera y salida dificulta su cobro; constituye una exposición de ingresos en disputa y no una pérdida definitiva demostrada del margen operacional.

En el ámbito de la gobernanza de datos y el cumplimiento legal, la empresa presenta una ceguera probatoria crítica. La trazabilidad documental se apoya en cerca de 6.000 fechas de vencimiento vivas (licencias de conducir, permisos de circulación, revisiones técnicas, certificados de transporte de sustancias peligrosas y seguros obligatorios) administradas manualmente en cuatro planillas de cálculo sin integridad referencial ni alarmas automáticas preventivas. A nivel de hardware instalado, existe una desconexión generalizada: se constata un registro histórico de cero descargas de tacógrafos digitales, 61 tractocamiones propios disponen de telemetría de fábrica (interfaces y señales por verificar) que nunca ha sido consultada ni integrada, 34 camiones de terceros carecen por completo de dispositivos satelitales GPS, y las 340 unidades restantes se encuentran fragmentadas en tres plataformas comerciales heterogéneas que impiden conformar una vista de mando operacional unificada.

Esta situación de vulnerabilidad adquiere carácter de riesgo existencial ante la proximidad del ciclo de renovación contractual fijado para el año 2029 por el cliente exportador principal de la compañía. Dicho mandante concentra el 19 % de la actividad comercial y facturación global de la empresa (superando ampliamente el total del margen neto corporativo del 9,0 %) y ha formalizado cuatro requerimientos de cumplimiento obligatorio e improrrogable:

1. Trazabilidad integral y posicionamiento de carga en tiempo real para el 100 % de los despachos asignados.
2. Emisión y tramitación de documentación electrónica de transporte sin redigitación manual ni soporte físico en papel (e-Docs para un volumen proyectado de 128.000 documentos anuales).
3. Acreditación técnica fehaciente del cumplimiento de los límites de jornada laboral y descansos obligatorios del Artículo 25 bis del Código del Trabajo para la totalidad de los conductores (tanto propios como externos de terceros) en cada viaje asignado.
4. Reportabilidad periódica y auditada de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI / CO2e) por tonelada-kilómetro transportada, calculada bajo el estándar internacional del marco GLEC (*Global Logistics Emissions Council*) / ISO 14083:2023.

El incumplimiento de estas exigencias hacia el año 2029 pondría en riesgo la continuidad del cliente que representa el 19 % de la facturación de Curimón. Esta concentración constituye una exposición relevante frente al margen operacional corporativo de 9,0 %; sin embargo, su efecto sobre el resultado y la solvencia requiere conocer los costos evitables y la contribución del contrato, datos que las bases no proporcionan. En consecuencia, el desafío técnico consiste en dimensionar estas brechas para fundamentar el alcance sin confundir el problema con las soluciones que se detallarán en los capítulos posteriores.

2.2 Comprensión del problema y de la necesidad

Para comprender la raíz del problema operacional de Transportes Curimón S.A., es indispensable contextualizar la actividad en la cadena de valor del transporte terrestre de carga interurbana en Chile, examinando las restricciones geográficas, comerciales y los marcos legales que gobiernan la circulación por carretera.

En la Figura 2.1 se describe el flujo operacional y la cadena de valor característica del transporte de carga en Curimón, ilustrando la secuencia de procesos desde la recepción de la orden de transporte hasta la liquidación final y cierre de costos.

El análisis de la Figura 2.1 permite constatar que la cadena de valor de Curimón se encuentra fragmentada por discontinuidades analíticas y operacionales en cada una de sus fases:

1. **Fase 1: Comercial y Recepción de Demanda:** Captura y formalización de solicitudes de transporte generadas por los 84 clientes corporativos de la cartera. Se realiza mediante registro manual en el sistema legado TMS 2013, correos

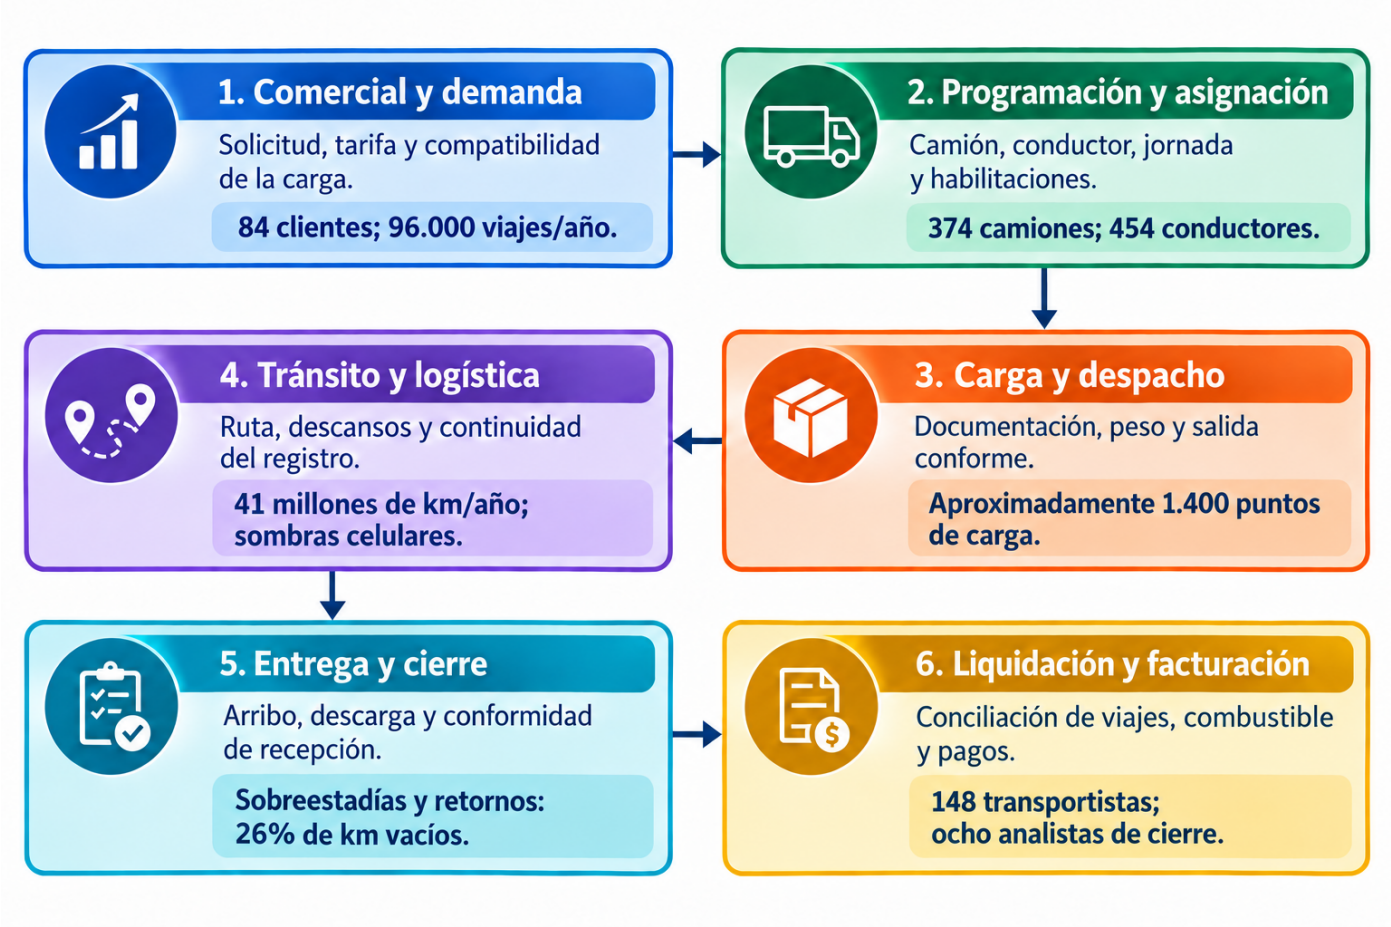


Figura 2.1 Flujo operacional y cadena de valor del transporte de carga en Curimón
Fuente: Elaboración propia.

electrónicos y llamadas telefónicas no estructuradas. Carece de validación automatizada de compatibilidad de carga al ingresar la orden (identificación tardía de requerimientos de cadena de frío, especificaciones D.S. 298 para sustancias peligrosas o restricciones de peso por eje según D.S. 158). audIT identifica un riesgo de comprometer itinerarios o tarifas sin información suficiente; las bases describen contratos deficitarios de hasta -14 % de margen, pero no cuantifican cuánto se explica por esta etapa del proceso.

2. **Fase 2: Programación y Asignación de Recursos:** Casamiento de órdenes de transporte con unidades de tracción (374 camiones) y tripulaciones (454 conductores). Los 22 despachadores de la Torre de Control de San Bernardo asignan viajes mediante llamadas telefónicas y consulta visual de cuatro planillas Excel desvinculadas entre sí. No existe validación algorítmica previa de jornada laboral (Artículo 25 bis del Código del Trabajo), lo que dificulta acreditar descanso suficiente antes del despacho y constituye un riesgo de seguridad que debe resolverse.

3. **Fase 3: Carga y Despacho en Instalaciones de Origen:** Posicionamiento del equipo en los recintos de clientes (≈ 1.400 puntos), faena de estiba y emisión de guías de despacho. Las demoras en andenes de carga promedian 3 horas 10 minutos y superan las 8 horas en la temporada agrícola de exportación. Al no existir integración telemática ni comprobación de peso por eje a la salida, los camiones quedan expuestos a infracciones por sobrepeso en plazas de pesaje del MOP (Caso, numeral 4.4, p. 10).

4. **Fase 4: Tránsito en Ruta y Logística Interurbana:** Circulación por el eje troncal de la Ruta 5 (3.000 km entre Antofagasta y Puerto Montt) y cruces internacionales por el Paso Los Libertadores (≈ 1.900 viajes anuales). La flota enfrenta sombras celulares de más de 80 kilómetros en zonas desérticas y cortes climáticos de hasta 12 días continuos (288 horas) en alta cordillera. audIT identifica riesgos de pérdida de transmisión y brechas de evidencia de jornada. Los cierres viales no acreditan desconexión durante igual período.

5. **Fase 5: Arribo, Descarga y Cierre de Entrega:** Recepción física en destino, descarga de mercancías y firma del comprobante de entrega en papel (*Proof of Delivery* [POD]). La falta de registro electrónico objetivo de entrada y salida genera la objeción del 71 % de los cobros de sobreestadías. Asimismo, el 4,2 % de los comprobantes de entrega en papel llegan incompletos, ilegibles o no llegan. Las bases registran además 26 % de kilómetros sin carga (10,66 millones de km); la asignación del viaje posterior depende hoy de teléfono y memoria. Esa coexistencia sustenta una necesidad de planificación, sin demostrar que todos los kilómetros vacíos correspondan a retornos o a una causa única.

6. **Fase 6: Liquidación, Costeo y Facturación:** Consolidación administrativa de fletes, pago a 148 transportistas terceros e imputación contable. Demanda ocho (8) profesionales durante nueve (9) días al cierre de cada mes, exhibiendo una tasa de error del 11 % en liquidaciones. El diésel se costea con un

desfase de hasta 40 días, impidiendo detectar a tiempo desvíos de rendimiento de hasta un 19 % entre vehículos gemelos.

2.2.1 Diagnóstico e interpretación causal de la cadena operacional

audIT analiza las brechas descritas en las bases y sus posibles relaciones operacionales. Las relaciones causales siguientes son interpretaciones del proponente; no constituyen mediciones de contribución ni nuevos testimonios del cliente:

1. **Subsidios Cruzados de Tarifas y Prorrateo Ciego:** La práctica contable de distribuir los costos operacionales en función de los ingresos brutos facturados por cada cliente ha encubierto la rentabilidad marginal real de cada servicio. El análisis financiero pormenorizado demuestra que tres contratos comerciales operan bajo costo, absorbiendo en conjunto el 31 % de los ingresos corporativos. El caso más crítico registra cuatro años consecutivos operando con un margen negativo de -14 %. Debido a que los costos directos de combustible, peajes de autopista y tarifas a terceros no se asocian de forma unívoca a la orden de transporte que los originó, las rutas altamente rentables financian de manera continua e invisible los déficits de los contratos ruinosos, distorsionando la estrategia comercial y mermando el margen de la compañía (9,0 %).

2. **Brecha Probatoria de Tacógrafo Digital y Ceguera de Descanso:** La omisión absoluta en la descarga de tacógrafos digitales (cero descargas históricas) y la falta de control sobre las actividades previas de los 258 conductores subcontratados generan un punto ciego operacional con severas ramificaciones legales. El incidente ocurrido en el kilómetro 312 de la Ruta 5 Sur (volcamiento de un tractocamión subcontratado a las 04:40 h por fatiga extrema del operador) expuso judicialmente que dicho chofer venía de cumplir un servicio continuo para otra empresa sin haber gozado del descanso legal mínimo. Bajo el régimen de subcontratación, la empresa carecía de registros para acreditar su debida diligencia patronal, lo que derivó en la suspensión de contratos comerciales durante seis semanas e investigaciones de la autoridad laboral.

3. **Dispersión Injustificada de Combustible y Rezago Analítico:** El combustible representa el 14 % de la estructura de costos de Curimón, posicionándose como el segundo rubro de mayor gasto de la compañía. La gestión de este recurso presenta dos deficiencias estructurales: por una parte, existe una dispersión de rendimiento de hasta un 19 % entre tractocamiones de idéntica marca, modelo y año asignados a una misma ruta geográfica; por otra parte, la conciliación de los consumos depende de la recepción mensual de las facturas consolidadas de las distribuidoras de combustible, lo que introduce un retraso analítico de hasta 40 días. Durante esta ventana temporal, la empresa desconoce anomalías como ralentí excesivo, desvíos de ruta, malos hábitos de aceleración o eventuales pérdidas en carretera, imposibilitando la aplicación oportuna de medidas correctivas.

4. **Vulnerabilidad de Infraestructura en Alta Montaña y Desierto:** El paso fronterizo Los Libertadores, por donde transitan aproximadamente 1.900 viajes

internacionales al año, permanece cerrado entre junio y septiembre por eventos meteorológicos extremos de nieve y viento blanco durante períodos que alcanzan hasta 12 días continuos (288 horas). Estos cierres afectan los itinerarios y las esperas; no acreditan por sí solos falta de cobertura celular durante todo el cierre. En paralelo, los corredores mineros de la Región de Antofagasta registran sombras de telecomunicaciones de más de 80 kilómetros. Al no concebirse la desconexión como un estado operacional estándar, el sistema pierde la posición de los vehículos, no puede actualizar itinerarios y queda expuesto a la pérdida de información crítica.

2.2.2 Fundamentación de la investigación externa aportada y marco normativo

audIT Soluciones Tecnológicas SpA ha incorporado en el análisis pericial del problema un conjunto de normativas y estándares externos que condicionan de manera directa la operación y fijan los requerimientos de diseño de cualquier arquitectura de procesos logísticos:

- **Ley N.° 20.123 sobre Trabajo en Régimen de Subcontratación:** Esta normativa establece que la empresa principal (Transportes Curimón S.A.) es solidaria o subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad y salud en el trabajo que afecten a los trabajadores de sus contratistas. Dado que el 56,8 % de los conductores que tripulan camiones a nombre de Curimón son dependientes de 148 microempresarios externos, cualquier infracción a los descansos legales, impago previsional o accidente con lesiones en carretera traslada la responsabilidad legal, civil e indemnizatoria directamente a Curimón si la compañía no ejerce de forma efectiva su derecho legal de información y retención. Esto impone la restricción de que Curimón debe validar la idoneidad y legalidad laboral del chofer externo de forma vinculante previo al despacho del viaje.
- **Artículo 25 bis del Código del Trabajo:** Regulado en el DFL N.° 1, fija el régimen especial de jornada laboral para choferes de carga terrestre interurbana. Establece un límite de conducción continua que no puede exceder de cinco (5) horas; un descanso obligatorio no inferior a dos (2) horas al término de cada ciclo de cinco horas; un descanso diario ininterrumpido de al menos ocho (8) horas dentro de cada período de veinticuatro horas; y un tope mensual ordinario de 180 horas distribuidas en no menos de veintiún días. audIT identifica riesgos de incumplimiento laboral y de responsabilidad ante un incidente; las bases no acreditan una anulación automática de pólizas ni procesos penales contra la plana ejecutiva.
- **D.S. N.° 298/1994 (MTT) frente a D.S. N.° 43/2015 (MINSAL) para Sustancias Peligrosas (SUSPEL):** Curimón dispone de 18 unidades especializadas en transporte de sustancias químicas. El marco regulatorio impone dos normativas complementarias pero con ámbitos físicos diferenciados:
  - El **D.S. N.° 298/1994** del MTT reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos, exigiendo antigüedad máxima permitida,

revisión técnica periódica específica, señalización reglamentaria NCh 2190, extintores adecuados, tacógrafo operativo, Hoja de Datos de Seguridad (HDS) en cabina y conductor capacitado con curso vigente.

  - El **D.S. N.° 43/2015** del MINSAL regula el almacenamiento de sustancias peligrosas en instalaciones fijas (Terminal Matriz San Bernardo y patios de acopio). Exige distancias de segregación química, pretiles de retención de derrames, sistemas de extinción certificados y prohíbe taxativamente la permanencia o pernoctación de camiones cargados con sustancias incompatibles en áreas no habilitadas.

- **Ley de Tránsito N.° 18.290 y Ley N.° 21.377 (Ley No Chat):** Tipifica como infracción gravísima la conducción de vehículos manipulando dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto digital que no venga incorporado de fábrica, a menos que su operación se realice mediante manos libres y sin desviar la vista del camino. Esta disposición introduce una restricción física y ergonómica inmutable: prohíbe que el conductor interactúe manualmente con pantallas o aplicaciones durante el movimiento vehicular ($v > 0$ km/h). Cualquier interacción manual debe limitarse a momentos de detención total comprobada, o bien gestionarse mediante mecanismos auditivos pasivos de síntesis vocal.

- **Marco GLEC (*Global Logistics Emissions Council*) / ISO 14083:2023:** Constituye el estándar internacional de referencia adoptado por las multinacionales exportadoras para el cálculo y auditoría de la huella de carbono en la cadena logística. Exige reportar las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por tonelada-kilómetro transportada (g CO2e/t-km), desagregando las fases *Well-to-Tank* (WTT) y *Tank-to-Wheel* (TTW). Si bien el marco normativo admite factores de emisión modelados o valores por defecto para tramos sin telemetría primaria, satisfacer el nivel de exigencia de auditoría del cliente exportador (19 % de ingresos) demanda priorizar mediciones empíricas de consumo de diésel sobre el motor vinculadas a la carga neta efectiva, acotando las estimaciones teóricas a contingencias debidamente documentadas.

- **Tacógrafo y control de jornada:** El tacógrafo aporta registros técnicos de conducción y velocidad; su descarga y custodia no acreditan automáticamente todo el descanso personal ni sustituyen el sistema de control de asistencia aplicable. La Resolución Exenta N.º 1213 de la Dirección del Trabajo, de 8 de octubre de 2009, regula un registro individual de asistencia, trabajo y descanso para carga interurbana y contempla un sistema automatizado opcional sujeto a aprobación. audIT conservará los archivos originales, identidad, integridad y trazabilidad y comprobará la autorización aplicable al sistema antes de atribuirle carácter de registro laboral. Una huella criptográfica acredita integridad contrastable, no por sí sola autenticidad, homologación o valor judicial. (Dirección del Trabajo, 2009).

2.2.3 Calendario operacional, estacionalidad y modelamiento de demanda

La dinámica anual de la operación exhibe una marcada disparidad entre la regularidad basal de la carga general y los picos pronunciados de la temporada agrícola, superpuestos a las ventanas de riesgo climático en la alta cordillera. En la Figura 2.2 se sintetiza el modelo estacional de demanda y se distinguen las restricciones de tránsito y conectividad.

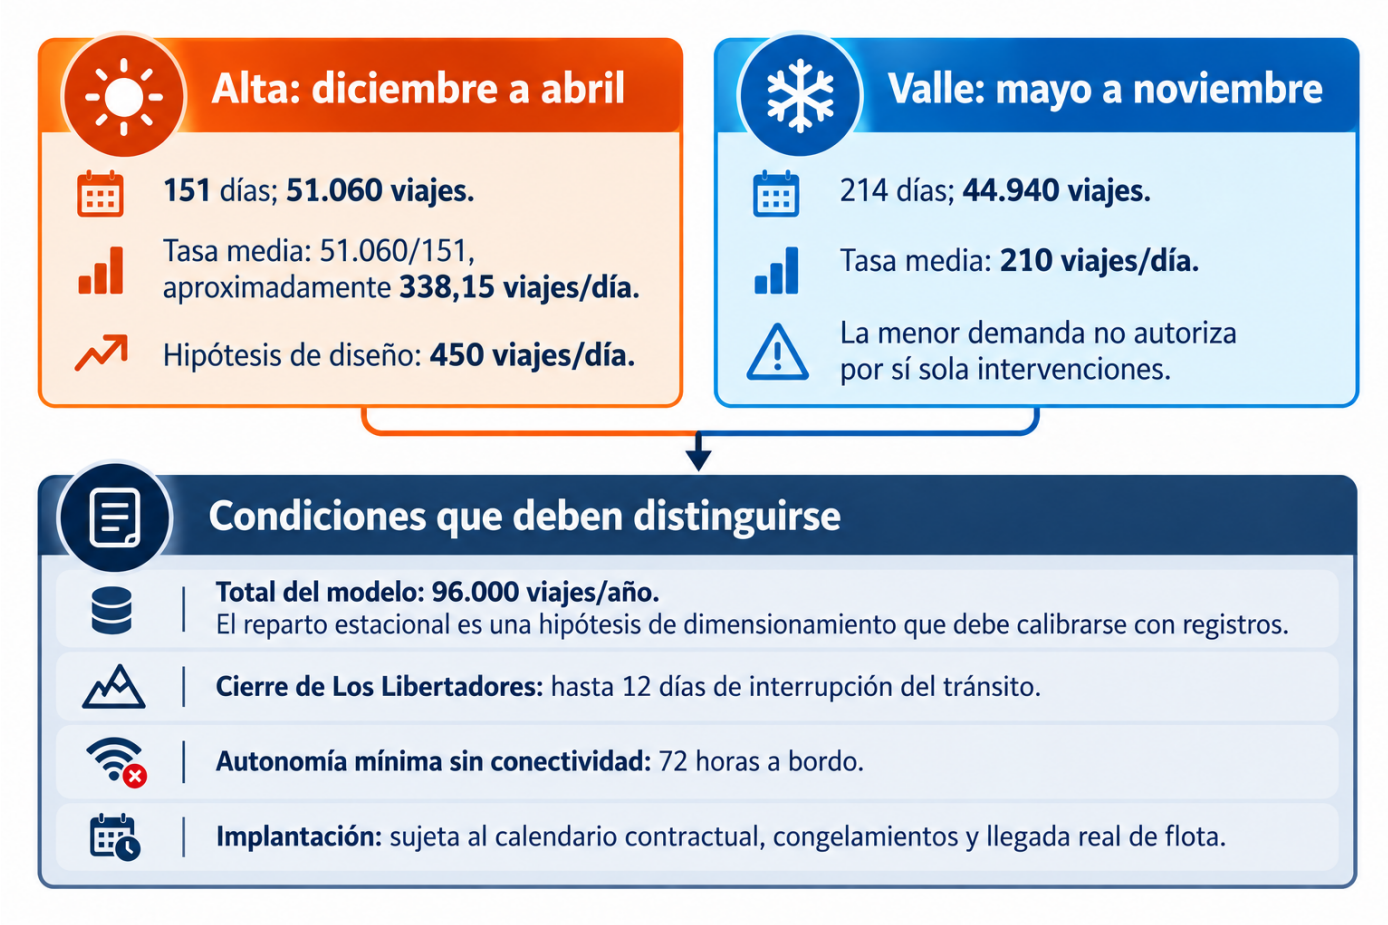


Figura 2.2 Calendario operacional y restricciones de despliegue
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 2.2 se apoya en el período protegido del Caso (Caso, RT-10.05, p. 32) y en su volumetría anual (Caso, numeral 14.1, pp. 29–30). A partir de esos antecedentes, audIT formula una hipótesis analítica de comportamiento de la demanda, pendiente de calibración y distinta de una medición de concurrencia, que cuantifica la operación normal frente a los períodos de saturación de punta:

1. **Temporada Frutícola de Alta Demanda (Diciembre a Abril, 151 días):** Corresponde al ciclo de cosecha y exportación hortofrutícola hacia los terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio. En este período se genera la máxima tensión sobre la flota rodante:
    - *Demanda diaria promedio en temporada alta (D alta):* Se modela en aproximadamente 338 viajes/día, lo que representa una concentración de

51.060 viajes en los 5 meses (53,2 % del volumen anual en el 41,4 % de los días del año).

- *Picos de demanda extrema (D punta):* Durante las semanas de saturación de cosecha e inspección fitosanitaria (enero-marzo) y coincidencia con ventanas de zarpe de buques refrigerados, se plantea como hipótesis de diseño una punta de entre 410 y 450 viajes/día, pendiente de calibración; no representa concurrencia.
- *Utilización de la flota de frío (44 equipos refrigerados):* La demanda de frío debe dimensionarse con el número de equipos, la duración real de los viajes y las esperas en andén y packings, que sobrepasan las 8 horas. Las bases no permiten deducir una cifra diaria de despachos refrigerados sin esos registros.
- *Restricción de despliegue (Congelamiento operacional):* Los camiones minimizan su paso por terminales centrales, lo que impone un congelamiento estricto sobre instalaciones o intervenciones físicas en cabina durante esta ventana.

2. **Temporada Valle y Operación Regular (Mayo a Noviembre, 214 días):** Caracterizada por flujos estables de carga general seca, graneles mineros e industriales, insumos químicos (18 camiones SUSPEL bajo D.S. N.° 298) y rutas troncales regulares:

   - *Demanda diaria promedio basal (D valle):* Se sitúa en 210 viajes/d, totalizando 44.940 viajes durante los 7 meses de operación regular.
   - *Comportamiento de la flota de frío:* Como hipótesis por validar, puede presentar menor actividad relativa en la zona central y reorientarse parcialmente a la industria salmonera y acuícola en la macrozona sur (Puerto Montt) sin un desglose diario de despachos refrigerados respaldado en las bases.
   - *Menor demanda relativa (Mayo a Agosto):* La menor demanda puede facilitar intervenciones, pero no constituye una ventana de implantación aprobada. Su disponibilidad depende de la llegada real de camiones, el calendario contractual y los congelamientos del caso.

3. **Cierres Invernales del Paso Los Libertadores (Junio a Septiembre):** El corredor internacional a Mendoza (≈ 1.900 viajes anuales) enfrenta temporales de nieve y viento blanco con cortes impredecibles de hasta 12 días continuos (288 horas). audIT identifica riesgos de espera, custodia de carga y reprogramación; el número de camiones inmovilizados, su emplazamiento y el cómputo de jornada deben verificarse para cada contingencia. El cierre interrumpe el tránsito y exige continuidad del registro de jornada y de las decisiones de operación. No implica por sí solo pérdida de conectividad durante los doce días; se distingue de las 72 horas mínimas sin cobertura a bordo.

4. **Ventanas de Facturación y Liquidación Mensual:** El período de cierre mensual, cuyas fechas efectivas deben verificarse, concentra el ciclo administrativo de facturación a 84 clientes y liquidación a 148 transportistas, requiriendo

9 días de proceso continuo por 8 analistas. Los despliegues de software deben desacoplarse de estos cierres para no perturbar la caja operativa de la compañía.

Ecuación de balance anual y declaración de incertidumbre paramétrica:. El balance cuantitativo verifica la consistencia del modelo frente al volumen consolidado de las bases; V representa el volumen anual y d, días:

$$V = (151\ \text{d} \times (51.060/151)\ \text{viajes/d}) + (214\ \text{d} \times 210\ \text{viajes/d}) \\ = 51.060 + 44.940 = 96.000\ \text{viajes/año} \tag{2.1}$$

La tasa exacta de temporada alta es 51.060/151, aproximadamente 338,15 viajes/día. El uso de 338,15 en el producto arrojaría 51.060,65 viajes; la ecuación utiliza la tasa sin redondear para conservar el total de 96.000.

El factor entre las demandas medias de temporada alta y valle se sitúa en (51.060/151) / 210, aproximadamente 1,61. Las bases aportan 96.000 viajes anuales y el período protegido, pero no su distribución mensual. El valor de 210 viajes/día en valle es un escenario de menor actividad, aproximadamente 20,2 % bajo la media anual de 263,01; no es una medición ni una consecuencia única del total anual. Elegido ese parámetro, la media alta se obtiene por balance: D alta = (96.000 - 214 × D valle) / 151. Con D valle de 178,5 y 241,5 viajes/día (variación de ±15 %), D alta resulta 382,79 y 293,50 viajes/día, respectivamente. El umbral de 450 viajes/día es una cota preliminar de ensayo, aproximadamente 33,1 % sobre la media alta basal de 338,15; no representa un máximo histórico demostrado ni una garantía frente a cualquier punta. Durante el levantamiento, antes de aprobar la línea base en el hito H1 de S7/T-14 (mes 2), se extraerán los registros diarios del TMS 2013, se documentarán completitud, días sin actividad, máximos y distribución estacional y se calibrará la cota antes de aprobar el perfil de carga. Si los datos exceden la cota, se actualizarán el dimensionamiento y los ensayos de aceptación. Viajes diarios y sesiones concurrentes se validan por separado.

2.3 Dimensionamiento del problema

El dimensionamiento cuantitativo del problema operacional de Transportes Curimón S.A. se sustenta en el análisis riguroso de las magnitudes físicas, financieras, territoriales y de seguridad que componen la actividad de la empresa. En la Tabla 2.1 se sintetizan los parámetros volumétricos consolidados que caracterizan la escala de la operación actual y las proyecciones requeridas para la estabilidad del servicio.

Tabla 2.1 Volumetría operacional y magnitudes del desafío logístico

Métrica Operacional	Línea Base	Proyección 3 Años	Unidad	Impacto en la Operación
Viajes Anuales Totales	96.000	118.000	viajes / año	Media: 263 viajes/día (hipótesis estacional: valle 210, alta aproximadamente 338,15 y punta de diseño 450 viajes/día; no son medidas de concurrencia).
Kilómetros Recorridos	41.000.000	50.000.000	km / año	Desgaste intensivo de activos y base de odometría para mantenimiento.
Kilómetros en Vacío	10.660.000	No informada	km / año	Corresponde al 26 % del kilometraje anual sin generar facturación.
Carga Total Transportada	2.400.000	2.900.000	ton / año	Exposición a 142 detenciones viales anuales por sobrepeso por eje.
Documentación D.E.T.	128.000	157.000	docs / año	Guías y documentos tributarios a emitir y respaldar sin papel.
Puntos de Carga y Descarga	1.400	1.700	recintos	Recintos de clientes donde se producen esperas medias de 3 h 10 min.
Vigencias Documentales	6.000	7.000	fechas	Fechas críticas de conductores y vehículos gestionadas en 4 Excel.
Cruces Paso Los Libertadores	1.900	2.400	cruces / año	Operación binacional sujeta a cierres climáticos de hasta 12 días.
Abastecimientos Diésel	74.000	90.000	eventos / año	Carga en estanque de San Bernardo y estaciones externas en ruta.
Pasadas de Peajes (TAG)	620.000	760.000	transacciones	Conciliación de peajes interurbanos desfasada sin costeo por ruta.
Migración Histórica TMS 2013	A estimar	N/A	viajes	Cinco años de viajes a migrar; volumen real por verificar según Caso, RT-05.15, p. 31.

El análisis de la Tabla 2.1 evidencia la magnitud transaccional que debe ser gobernada. La persistencia de un 26 % de kilómetros en vacío (10,66 millones de km) consume combustible, tiempo y capacidad sin carga transportada; su efecto monetario requiere los costos y condiciones de cada recorrido.

En la Figura 2.3 se expone la cadena operacional que articula los principales problemas diagnosticados en Curimón, planteando el análisis del proponente sobre cómo los vacíos en la captura de datos primarios podrían propagarse hasta comprometer el margen corporativo y amenazar la continuidad de los contratos comerciales.

Las flechas de la Figura 2.3 representan la interpretación operacional de audIT sobre mecanismos que pueden relacionar las condiciones observadas y sus efec-



Figura 2.3 Relaciones operacionales entre registros, decisiones e impactos
Fuente: Elaboración propia.

tos. Los porcentajes y plazos corresponden al diagnóstico del caso; su coexistencia no cuantifica cuánto del efecto puede atribuirse a cada condición. En particular, el gráfico no atribuye los cuatro siniestros con lesiones a fatiga ni transforma sobreestadías objetadas en pérdidas definitivas.

2.3.1 Análisis de los 7 bloques de datos duros de Curimón

A partir de la cadena causal expuesta, se dimensiona el impacto numérico de los siete bloques de datos duros que estructuran la operación:

1. **Parque Vehicular y Asimetría de Tenencia:** La flota totaliza 374 tractocamiones, divididos en 148 unidades propias (39,6 %, con antigüedad media de 6,4 años) y 226 unidades subcontratadas (60,4 %). A esto se añaden 210 semirremolques propios. Las bases informan separadamente 44 equipos refrigerados y 18 camiones habilitados para sustancias peligrosas; estas cantidades no definen una partición de los 210 semirremolques. Los 226 camiones subcontratados pertenecen a 148 transportistas independientes que poseen entre 1 y 4 vehículos. Curimón responde por el viaje que despacha, pero no es el empleador de los conductores externos ni propietaria del 60,4 % de los tractocamiones motrices, impidiendo cualquier política de estandarización por imposición jerárquica.

2. **Fuerza Conductora y Brecha de Control de Jornada:** La fuerza laboral asignable suma 454 conductores: 196 dependientes con contrato indefinido en Curimón y 258 choferes dependientes de los 148 transportistas terceros. La ausencia de descargas de tacógrafos digitales y la carencia de control sobre las actividades previas de los choferes externos implican que la empresa despacha viajes sin verificar si el conductor ha descansado las 8 horas mínimas o si superó las 5 horas continuas de conducción (Art. 25 bis). En los últimos tres años se han documentado cuatro (4) siniestros con lesiones, uno de ellos grave, El accidente del kilómetro 312 se analiza como incidente específico, sin atribuir su causa al conjunto de los cuatro siniestros.

3. **Red Vial, Kilometraje y Retornos en Vacío:** La flota recorre 41 millones de kilómetros al año a lo largo de un corredor de 3.000 kilómetros. Las bases registran que el 26 % de la distancia total (10,66 millones de km) se recorra en vacío. La magnitud acreditada es 10,66 millones de kilómetros vacíos; no permite determinar cuántos camiones permanecen ociosos.

4. **Control Documental Fragmentado y Recursos Tecnológicos Subutilizados:** La administración manual de aproximadamente 6.000 fechas vivas de vigencia en cuatro planillas de cálculo aisladas sin validación cruzada ha derivado en fallas graves, como la inmovilización de una unidad SUSPEL por 14 horas en abril de 2026 debido a un certificado vencido hace tres semanas. Asimismo, se evidencia una subutilización tecnológica crítica: 61 tractocamiones propios cuentan con módulos telemáticos de fábrica que nunca han sido leídos; 34 camiones externos circulan sin GPS; y 192 unidades de terceros cuentan con GPS. Las tres plataformas sin vista unificada abarcan los 340 camiones con GPS; sus proveedores, interfaces y permisos deberán verificarse.

5. **Fricción comercial y cobros de sobreestadías en disputa:** La detención en los 1.400 recintos de carga y descarga genera tiempos muertos no imputables al transporte, promediando 3 horas 10 minutos y superando las 8 horas en la temporada agrícola. El 71 % de los cobros emitidos por concepto de sobreestadías resulta sistemáticamente objetado por los clientes debido a la inexistencia de registros objetivos e inalterables que acrediten la permanencia en andén. El 71 % corresponde a cobros objetados, no a una pérdida definitiva acreditada. La relación entre ese monto y el margen operacional es una exposición potencial, sujeta al resultado del cobro. A esto se suma que el 4,2 % de los comprobantes de entrega en papel (*Proof of Delivery* [POD]) llegan incompletos, ilegibles o no llegan, demorando el ciclo de facturación y cobro.

6. **Estructura Financiera y Subsidios Cruzados:** La empresa opera con un margen consolidado estrecho del 9,0 %. La estructura de costos se distribuye principalmente en: 38 % para pagos a transportistas terceros, 14 % en combustible de flota propia y 12 % en remuneraciones de choferes propios. La asignación de costos por prorrateo ciego encubre que 3 de los 8 contratos principales (que concentran el 31 % de los ingresos corporativos) operan bajo la línea de costo técnico, registrándose un contrato con un margen negativo sostenido de -14 % durante cuatro años. En paralelo, el diésel exhibe una dispersión injustificada de rendimiento del 19 % entre vehículos idénticos en la misma ruta, cuya causa se desconoce debido al desfase de 40 días en la recepción de facturas.

7. **Seguridad Vial, Pesajes y Riesgo Existencial:** Durante el año 2025, la flota registró 142 detenciones formales en plazas de pesaje del Ministerio de Obras Públicas por infringir los límites de peso máximo por eje establecidos en el D.S. N.° 158/1980, sumando 2.556 horas-camión inmovilizadas (promedio de 18 horas de detención por infracción). Este descontrol vial y documental colisiona frontalmente con el ultimátum impuesto por el cliente exportador mayor, el cual concentra el 19 % de la actividad comercial y facturación global de la empresa (magnitud distinta del margen operacional corporativo del 9,0 %), quien ha condicionado la renovación contractual de 2029 a la certificación de jornada en el 100 % de los viajes, digitalización documental sin papel, posicionamiento continuo y auditoría de emisiones de GEI bajo marco GLEC / ISO 14083.

2.3.2 Caracterización territorial y mapeo de nodos críticos

El despliegue territorial de Transportes Curimón S.A. abarca una red física y logística compleja compuesta por seis tipologías de nodos operacionales, cuya infraestructura actual impone severas restricciones técnicas que deben ser consideradas en el diagnóstico. En la Tabla 2.2 se sintetizan las características y niveles de criticidad de los nodos que conforman la red operacional de la empresa.

Tabla 2.2 Síntesis de nodos críticos de la red operacional

Nodo Operacional	Tipología e Instalación	Enlaces	Restricción Crítica Identificada	Criticidad
Terminal San Bernardo	Casa matriz, torre 24x7, taller central, estanque diésel.	Dos enlaces de proveedores distintos; tecnologías por verificar.	Sala servidores 26 m², split doméstico y UPS 20 min (FEP02, Cap. 6, pp. 14–16).	Máxima
Terminales Regionales (4)	Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt.	Enlaces comerciales locales; 3 de 4 sin respaldo.	Vulnerabilidad de enlace; puntos de relevo macrozonas norte, centro y sur.	Alta
Talleres Propios (2)	San Bernardo y Los Ángeles; 46 operarios técnicos.	Dos talleres propios; intervenciones en ruta por talleres externos.	Paso por terminal cada 6 días en promedio; 22 % de terceros pasa menos de una vez al mes.	Alta
Paso Los Libertadores	Corredor binacional a Mendoza (≈ 1.900 viajes).	Conectividad celular precaria de montaña.	Cierres fronterizos de hasta doce días; no implican necesariamente falta de señal.	Crítica
Zonas de Sombra Celular	Ruta 5 Norte (Atacama) y tramos cordilleranos.	Cero cobertura en tramos > 80 km.	Pérdida de transmisión telemática en tiempo real y bloqueo e-Docs.	Crítica
Puntos de Clientes (≈ 1.400)	Plantas, packings, mineras y recintos portuarios.	Infraestructura ajena; sin equipos fijos.	Esperas no acreditadas (3 h 10 min a > 8 h); 71 % sobreestadías objetadas.	Alta

El análisis de la Tabla 2.2 expone que la sala de servidores ubicada en el Terminal San Bernardo (26 m², climatización por split doméstico, una UPS con 20 minutos de autonomía y condiciones de respaldo energético que deben verificarse) incumple formalmente los requerimientos de infraestructura física estipulados en las Bases Técnicas Transversales (Caso, RT-06.01, p. 32 a FEP02, RT-06.09, p. 15). La sala debe remediarse o reemplazarse para cumplir el estándar exigido; su estado actual no permite presumir una infraestructura apta para la operación de misión crítica.

Los tramos con más de 80 kilómetros sin cobertura en la Ruta 5 Norte impiden asumir conectividad permanente. Separadamente, los cierres del Paso Los Libertadores de hasta doce días exigen continuidad de registro y reprogramación; no acreditan ausencia de señal durante todo el cierre. La desconexión es una condición física intrínseca a la geografía chilena, y la información operacional debe conservarse y sincronizarse al recuperar la cobertura, conforme a los mínimos del caso.

2.4 Actores y Grupos de Interés

La operación y gobernanza de Transportes Curimón S.A. involucra a un ecosistema diverso de trece (13) actores clave, cuyos intereses, expectativas y capacidades de bloqueo determinan la viabilidad de cualquier transformación en los procesos corporativos. El catálogo incluye tres actores de capital, fiscalización y aseguramiento: el **Fondo de Inversión Institucional**, la **Dirección del Trabajo (DT)** y la **Aseguradora de Carga y Flota**.

En la Figura 2.4 se ilustra el mapeo de actores en la Matriz de Poder e Influencia frente al Nivel de Interés, identificando la estrategia de gestión corporativa requerida para cada uno.



Figura 2.4 Poder efectivo e interés operativo de los 13 actores de Curimón
Fuente: Elaboración propia.

El poder de la Figura 2.4 mide la capacidad efectiva de condicionar continuidad, cumplimiento o viabilidad del proyecto; no equivale sólo a autoridad jerárquica. La unidad de análisis es el grupo de interés considerado colectivamente; su clasificación no se traslada automáticamente a cada integrante. El eje de interés describe participación en la operación diaria, no la importancia estratégica del contrato. Q3 y Q4 quedan sin grupos asignados bajo este criterio, sin afirmar que no existan personas individuales de bajo poder formal. Los 148 transportistas controlan 226 de 374 camiones (60,43 %); su bajo poder societario no reduce su influencia operacional. Los conductores poseen capacidad colectiva de afectar la ejecución segura

del viaje. TI y Mantenimiento condicionan integraciones e intervención física y, por ello, tampoco se clasifican como actores de bajo poder.

Los nueve actores de alto interés operativo se gestionan de cerca; las cuatro entidades de capital, fiscalización y aseguramiento se mantienen satisfechas mediante evidencia de riesgos y cumplimiento. No se fuerza presencia en los cuadrantes de bajo poder. En el Anexo 2.D se distinguen autoridad formal, veto operacional, expectativas y mecanismo de interacción de cada actor.

En la Tabla 2.3 se sintetizan las características, expectativas y riesgos asociados a cada uno de los trece actores del ecosistema.

Tabla 2.3 Matriz sintética de actores y grupos de interés

Actor	Dotación / Poder	Dolor Operacional Principal	Capacidad Bloqueo	Nivel de Riesgo
1. Fondo Inversión	22 % propiedad.	Pasivos laborales contingentes y caída del margen (9,0 %).	Máxima (Directorio)	Financiero / Gobierno
2. Dirección Trabajo	Ente fiscalizador.	Cero descargas de tacógrafos e infracción Art. 25 bis.	Extrema (Clausura)	Legal / Regulatorio
3. Aseguradora Carga	Cobertura pólizas.	Opacidad en siniestros y falta de registro térmico.	Alta (Cobertura)	Financiero / Pólizas
4. Familia Fundadora	78 % propiedad.	Daño reputacional y amenaza existencial ultimátum 2029.	Máxima (Societaria)	Estratégico
5. Gerencia General	E. Valdebenito.	Fractura entre responsabilidad 100 % y control terceros.	Máxima (Ejecutiva)	Operacional y penal
6. Gerencia Operaciones	R. Mansilla.	Asignación a ciegas, 26 % de kilómetros vacíos y 3 GPS.	Alta (Despacho)	Fricción operacional
7. Gerencia Finanzas	G. Ossandón.	3 contratos a pérdida (-14 %), diésel con 40 d desfase.	Alta (Financiera)	Rentabilidad
8. Mantenimiento	H. Trincado.	Preventivo por adivinanza; 61 módulos telemáticos de fábrica sin descargar.	Alta (Intervención)	Falla en ruta
9. Prevención Riesgos	D. Aguayo.	Responsabilidad solidaria; 6.000 vigencias en Excel.	Alta (Veto legal)	Siniestralidad / Multas
10. TI y Flota	M. Riquelme / P. Kast.	TMS 2013 rígido, 34 camiones sin GPS y 9 personas TI.	Alta (Técnica)	Obsolescencia / Silos
11. Choferes Propios	196 choferes.	Fatiga en ruta, bermas inseguras, esperas >8 h andén.	Alta (De facto)	Seguridad / Sindical
12. Terceros Externos	148 dueños.	Vulneración soberanía activo, liquidación lenta y errores.	Muy Alta (Colectiva)	Desabastecimiento 60 %
13. Cliente Exportador	A. Lecaros (19 %).	Incumplimiento exigencias 2029 (CO2e GLEC, e-Docs).	Extrema (Comercial)	Quiebre facturación

2.4.1 Principios de arbitraje de las seis tensiones operacionales

El análisis de actores permite identificar seis tensiones entre necesidades del negocio. Se explicitan los intereses y el criterio de conciliación; los procedimientos, responsables y mecanismos técnicos corresponden al alcance y las reglas de S3.

1. **Privacidad y evidencia de jornada:** Curimón necesita antecedentes suficientes para acreditar la aptitud del conductor y la ejecución del viaje; los terceros requieren preservar la privacidad de su operación ajena a Curimón. El cri-

terio es obtener información pertinente, autorizada y verificable para cada finalidad, distinguiendo la evidencia de jornada previa de la visibilidad de posición durante el viaje. Los permisos, ventanas y mecanismos de tratamiento se desarrollan en S3 y S5.

2. **Urgencia de despacho y seguridad:** Operaciones requiere cumplir itinerarios, mientras Prevención necesita comprobar jornada, descanso, documentación y aptitud. La seguridad y las condiciones habilitantes prevalecen sobre la urgencia comercial. Debe distinguirse una condición incumplida de la indisponibilidad temporal de una fuente: esta última no demuestra cumplimiento ni habilita por sí sola una salida. La verificación y el tratamiento de excepciones se rigen por RN-03, RN-04 y RN-11 de S3/T-12; S2 no establece un procedimiento ni autorizadores alternativos.

3. **Autonomía de terceros e información de flota:** Se requiere acceso autorizado, suficiente y verificable a los datos de los viajes de Curimón, respetando los sistemas ajenos y evitando atribuirse información de otros clientes. S3 §3.1 presenta la integración; §3.2.5 delimita las exclusiones y la preservación de plataformas de terceros; §3.4.3 desarrolla adhesión, permisos e incentivos. Estas son decisiones de solución, no hechos del diagnóstico.

4. **Entrega y descansos:** Los compromisos comerciales deben considerar tiempos de viaje, esperas, descansos y lugares seguros de detención. El criterio es una planificación operacionalmente viable que preserve seguridad y condiciones habilitantes, sin trasladar al conductor la presión de cumplir un itinerario incompatible con ellas.

5. **Costeo por viaje y prorrateo:** Finanzas necesita identificar costos directos y contribución por viaje, ruta y contrato para decidir sobre los tres contratos deficitarios. El criterio es producir evidencia atribuible y distinguir estimación operacional de conciliación contable. La información permite revisar subsidios cruzados y tarifas; no garantiza por sí sola que desaparezcan las pérdidas.

6. **Trazabilidad y heterogeneidad tecnológica:** El cliente exportador requiere información consistente frente a fuentes y equipos distintos. El criterio es obtener datos comparables, atribuibles y con cobertura efectiva declarada, sin presumir que todas las fuentes entregan las mismas señales. La normalización e integración se desarrollan en S3/S4 y la gestión de datos en S5.

2.5 Resumen de Requerimientos, Supuestos, Exclusiones y Restricciones

El cierre analítico del diagnóstico operacional consolida las condiciones de contorno que delimitan el alcance del proyecto. Conforme a las directrices de ingeniería, en este acápite se sintetizan las necesidades del mandante y se formula una matriz de supuestos de ingeniería que evalúa el impacto de eventuales contingencias.

2.5.1 Síntesis de requerimientos del negocio y operacionales preliminares

El Anexo 2.A reúne 25 necesidades preliminares, `REQ-NEG-01` a `REQ-NEG-25`, con su fuente y trazabilidad. S3/T-12 desarrolla el catálogo base de 42 requerimientos del sistema: 28 funcionales (`RF-001` a `RF-028`) y 14 no funcionales (`RNF-001` a `RNF-014`). La correspondencia no es uno a uno: una necesidad puede originar varios requerimientos. REQ-NEG-08, monitoreo térmico, se atiende mediante la innovación 3 de S13/T-19, fuera del catálogo base pero dentro de la oferta. S2 identifica las necesidades sin prescribir sus mecanismos técnicos. La síntesis se organiza en cuatro dominios:

1. **Dominio de Asignación y Control Operacional:** Capacidad de verificar en tiempo real (< 30 s) la disponibilidad legal del conductor (Art. 25 bis), idoneidad mecánica del camión, vigencia de 6.000 fechas documentales y compatibilidad de carga antes de liberar una orden de transporte.
2. **Dominio de Trazabilidad y Gestión de Esperas:** Acreditación automática de arribos, esperas y salidas en los 1.400 puntos de clientes, generando registros íntegros y atribuibles para sustentar los cobros que correspondan según cada contrato, sin garantizar su aceptación o recuperación.
3. **Dominio de Documentación Digital y Continuidad en Sombra:** Disponibilidad de Documentos Electrónicos de Transporte conformes (DET para ≈ 128.000 emisiones anuales) antes del movimiento, incluso en puntos de carga sin cobertura, conservando al sistema contable como único emisor tributario.
4. **Dominio de Costeo y Sostenibilidad:** Reconstrucción analítica diaria (< 24 h) del costo directo por viaje (combustible por telemetría CAN bus, peajes y flete a terceros) y cálculo de huella de carbono (g CO2e/t-km) bajo estándar GLEC para el 100 % de la flota.

En el plano de los **Requerimientos No Funcionales Canónicos y de Resiliencia** (FEP01, Artículo 78, p. 40 y FEP02, Cap. 7, pp. 17–18), el diagnóstico fija los siguientes umbrales contractuales vinculantes para cualquier solución propuesta:

- **Disponibilidad crítica (SLA):** Disponibilidad mensual ≥ 99,9 % para servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo en régimen continuo de 24 horas al día, 365 días al año.
- **Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO):** RTO ≤ 4 horas ante contingencias mayores o eventos de desastre en el centro de datos principal.
- **Objetivo de Punto de Recuperación (RPO):** RPO ≤ 15 minutos de pérdida máxima de datos transaccionales con mecanismo de recuperación que deberá justificarse en la solución.
- **Autonomía Telemática Desconectada:** Mínimo contractual exigido de 72 horas de persistencia autónoma a bordo sin conectividad celular (Caso 10, RT-03.10). La operación internacional documenta contingencias climáticas de hasta doce días continuos (288 horas) por cierres del Paso Los Libertadores

(Caso, Cap. 4.6), sin que esa detención implique una pérdida de conectividad de igual duración. La gestión de jornada, carga y reprogramación debe absorber el cierre sin desplazar hitos contractuales.

La integración documental conservará al sistema contable y de facturación de Curimón como único emisor de documentos tributarios; la propuesta aporta los datos y la trazabilidad sin sustituir esa función. El cliente adquiere el equipamiento y audIT debe especificar cantidades y características, sin presumir infraestructura disponible. Se mantienen dos umbrales distintos de autonomía: 72 horas a bordo y 24 horas mínimas en terminales, aplicando la exigencia administrativa más estricta frente a las 12 horas del Caso 10.

2.5.2 Matriz de supuestos de ingeniería de proyectos

Los seis supuestos de la Tabla 2.4 son condiciones del entorno que todavía deben comprobarse para sostener el alcance. Los hechos del Caso fundamentan su relevancia, pero no acreditan que la condición se cumpla ni permiten asignar una probabilidad de éxito o de falla. Por ello se declara el estado de evidencia, el impacto si el supuesto resulta falso y la comprobación requerida. No se atribuyen probabilidades a observaciones que aún no existen. Las contingencias y decisiones de implementación corresponden al Subdocumento 3 y a las vistas de arquitectura.

Tabla 2.4 Matriz de supuestos clave de ingeniería de proyectos

Supuesto	Evidencia disponible	Impacto si falla	Validación requerida
SUP-01: Adhesión suficiente	148 transportistas; no se acredita adhesión efectiva	Crítico: cobertura de jornada y datos de terceros no demostrada	Cotejar participación, permisos y cobertura por etapa
SUP-02: Acceso a GPS	Tres plataformas; 192 terceros con GPS; acceso no comprobado	Alto: visibilidad y trazabilidad incompletas	Verificar acceso autorizado y datos por plataforma
SUP-03: Extracción del TMS	Sistema de gestión de 2013; calidad y extracción no acreditadas	Alto: migración y conciliación no sustentadas	Perfilar una extracción y cotejarla con el origen
SUP-04: Entorno de continuidad	Autonomía exigida de 72 h; cierres viales de hasta doce días	Crítico: evidencia y planificación pueden quedar incompletas	Caracterizar cobertura y cierres por separado
SUP-05: Telemetría accesible	61 equipos con telemetría; lectura y autorización no comprobadas	Alto: beneficios de mantenimiento sin datos verificables	Cotejar autorización y lectura por fabricante
SUP-06: Ventanas en terminal	Paso medio cada seis días; 22 % de terceros, menos de una vez al mes	Alto: cobertura de despliegue fuera del plazo comprometido	Comprobar visitas y ventanas por unidad

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, capítulos 2, 4, 5 y 10, numeral 14.1 y RT-03.10 y RT-17.06. Las validaciones descritas son actividades previstas, no comprobaciones ya realizadas.

SUP-01. Adhesión suficiente para la cobertura comprometida. Se supone que la participación autorizada de los transportistas permitirá obtener los antecedentes exigidos para las cohortes y etapas del alcance. El Caso identifica 148 empresarios independientes y la conducción para otros clientes (numeral 4.3 y restricción 2 del capítulo 10); no acredita firmas ni un porcentaje de adhesión. Antes de comprometer una cohorte debe cotejarse un registro por transportista, vehículo y conductor, con permisos, finalidad y vigencia. El supuesto se acepta sólo si la cobertura resultante sostiene las funciones comprometidas para esa cohorte. Si no se cumple, quedan sin acreditar la jornada previa y parte de la trazabilidad; la solución debe declarar cobertura efectiva y tratamiento de no adhesión, sin sustituir evidencia personal faltante por un dato del camión.

SUP-02. Acceso autorizado y suficiente a las plataformas GPS. Se supone que podrán obtenerse datos identificables, fechados y con actualización suficiente para los viajes incluidos. El capítulo 5 y RT-17.06 confirman tres plataformas existentes; no confirman permisos, interfaces ni exportación utilizable. Debe comprobarse cada plataforma por separado, identificando proveedor, derecho de acceso, vehículos cubiertos, campos, sellos de tiempo, frecuencia y restricciones. La aceptación requiere una muestra autorizada y conciliada con vehículo y viaje, con cobertura suficiente para la función declarada. Si alguna plataforma no permite acceso, la cobertura de los 192 terceros con GPS no puede darse por resuelta; su efecto y alternativa deben quedar explícitos en el alcance, sin presumir cambio de equipos ni acceso a datos privados.

SUP-03. Extracción y calidad del sistema de gestión de 2013. Se supone que será posible obtener información suficiente para migrar y conciliar los dominios seleccionados. El capítulo 5 acredita el sistema existente, no la calidad ni la facilidad de extracción. Deben identificarse autorizaciones, tablas o archivos, claves, períodos, duplicados, faltantes y relación con los documentos contables. Una muestra debe cotejar cantidades, identificadores y valores con el origen; las diferencias y los criterios de aceptación por dominio se documentan antes de fijar el corte. Si falla, el histórico y la duración de migración permanecen sin acreditar y requieren ajuste de alcance o planificación. Esta comprobación distingue el TMS del sistema contable, cuya función de emisor se conserva.

SUP-04. Caracterización separada de conectividad y acceso vial. Se supone que podrán caracterizarse las interrupciones relevantes por corredor para comprobar la continuidad exigida. RT-03.10 fija al menos 72 horas de autonomía a bordo; el numeral 4.6 describe cierres del paso de hasta doce días. Un cierre vial no demuestra una interrupción celular de igual duración. Deben documentarse por separado cobertura, duración sin señal, detención, jornada y necesidad de reprogramación mediante antecedentes de ruta y pruebas de continuidad previstas. El supuesto se acepta cuando ambos escenarios están identificados y pueden verificarse contra sus requisitos. Si faltan antecedentes, no se acredita la suficiencia de la operación ni se extrapolan las 72 horas para resolver automáticamente un cierre de doce días.

SUP-05. Lectura permitida de telemetría de fábrica. Se supone que la información disponible en los 61 tractocamiones podrá leerse bajo autorización del fabricante y con garantías preservadas. El Caso, numeral 14.1 y RT-17.06, acredita la disponibilidad y exige integración de solo lectura; no acredita acceso operativo. Deben cotejarse fabricante, modelo, autorización, señales accesibles, unidades, frecuencia, identificación y restricciones de garantía. La aceptación requiere una lectura autorizada de muestra, con valores identificables y consistentes. Si un fabricante no autoriza o no entrega las señales requeridas, no puede atribuirse a esos vehículos el beneficio de mantenimiento o consumo apoyado en esa telemetría; el alcance debe mostrar la cobertura real y resolver la dependencia sin intervención no autorizada.

SUP-06. Visitas y ventanas suficientes en terminales. Se supone que las visitas efectivas permitirán intervenir las unidades dentro del calendario obligatorio y sin detener la flota. El capítulo 10 informa un paso medio cada seis días y un 22 % de subcontratados con frecuencia inferior a una visita mensual; el promedio no garantiza una oportunidad para cada camión. Deben cotejarse registros y programación por unidad, duración disponible y restricciones estacionales. La aceptación requiere una oportunidad documentada por unidad de la cohorte y una cobertura acumulada compatible con sus hitos. Si no se cumple, el ritmo de despliegue y su cobertura quedan afectados; el plan debe explicitar ese efecto y su contingencia, sin suponer visitas uniformes ni desplazar hitos contractuales.

Condicionantes de las veintiséis decisiones de diseño del Caso (§16.1):. El Anexo 2.E de `AUDIT-Subdocumento2-Anexos.pdf` identifica las 26 decisiones, sus necesidades de origen, restricciones y datos que deben comprobarse. Este diagnóstico no prescribe sus implementaciones. La resolución y su trazabilidad corresponden al alcance y a las vistas técnicas de la solución; se conservan como condiciones críticas la jornada previa de terceros, la adhesión de los 148 transportistas y la llegada física de camiones a terminales.

2.5.3 Exclusiones y restricciones principales

Esta síntesis distingue límites de prestación, condicionantes operacionales y prestaciones adicionales. Las exclusiones detalladas del Caso se desarrollan en S3 §3.2.5; aquí se conservan sus dependencias relevantes para el diagnóstico.

- **Exclusiones y límites de prestación:** audIT no provee combustible físico, repuestos mecánicos ni reparación de motores o carrocerías. Esto no excluye gestionar la hoja de vida, registrar intervenciones de talleres o apoyar la planificación del mantenimiento; tampoco excluye reponer el equipamiento tecnológico conforme a las condiciones comprometidas. El ERP contable se conserva: su licenciamiento, modificación del código base y administración no forman parte de la prestación; deben comprobarse los derechos e interfaces de acceso y mantenerse su función de único emisor tributario.
- **Condicionantes operacionales y de infraestructura:** No se exige interacción táctil del conductor en marcha. Las intervenciones del equipamiento embarcado se limitan al paso por terminal y a las ventanas permitidas del caso. La

infraestructura local de San Bernardo debe remediarse o reemplazarse; no se presume aptitud ni se excluyen los acondicionamientos necesarios para su componente de alta resiliencia.

- **Necesidad atendida mediante prestación adicional:** El monitoreo de los 44 equipos refrigerados (REQ-NEG-08) se atiende por la innovación 3 de S13/T-19. Comprende registros de temperatura y apertura de puerta y alertas según carga, contrato y condiciones de homologación. Está fuera del catálogo base S3/T-12, no fuera de la oferta. Los registros y alertas no garantizan por sí solos la conservación térmica de la carga.

Regla de presentación de la oferta técnica. Conforme al FEP01, Artículo 50.2, p. 29, este documento no incorpora tarifas, honorarios ni costos monetarios de la oferta económica. Esta es una condición de presentación, no una restricción de operación del transporte.

El uso de servicios en la nube no exime de remediar o reemplazar el emplazamiento local exigido por el caso, ni de especificar su energía, comunicaciones y seguridad física. Las exclusiones de obras civiles mayores no eliminan esos acondicionamientos necesarios.
Los catálogos exhaustivos de requerimientos preliminares, el inventario detallado del parque vehicular y conductores, la matriz exhaustiva de restricciones legales, las trece fichas completas de caracterización de actores y el registro integral de las veintiséis decisiones de diseño del Caso §16.1 se entregan en el documento independiente `AUDIT-Subdocumento2-Anexos.pdf`, el cual complementa el presente diagnóstico conforme a las directrices del Comunicado 10.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.377 que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la conducción manipulando dispositivos de telefonía móvil u otro artefacto electrónico. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166014

Dirección del Trabajo. (2009, 8 de octubre). *Resolución Exenta N.º 1213: sistema obligatorio de control de asistencia, horas de trabajo y descanso para choferes de carga terrestre interurbana*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1007210 (citada en el folio 15).

ISO. (2023). ISO 14083. Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations.

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales.

Ministerio de Obras Públicas. (1980). Decreto Supremo N.º 158. Fija peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos.

Ministerio de Salud. (2015). Decreto Supremo N.º 43. Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

Ministerio del Trabajo. (2006). Ley N.º 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación.

Smart Freight Centre. (2023). GLEC Framework for logistics emissions accounting and reporting, version 3.0.

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Párrafo Apertura S2	Asistente LLM	Ajuste estilístico de redacción introductoria	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de claridad del resumen y de la separación entre datos de las bases, cálculos e hipótesis.
2.1 Resumen Ejecutivo	Asistente LLM	Síntesis ejecutiva de la problemática	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura, aclaración de sobreestadías y kilómetros vacíos y revisión de consistencia de magnitudes y efectos descritos.
2.2 Comprensión del Problema	Asistente LLM y generación de imágenes	Redacción del diagnóstico; corrección de atribución de sensor térmico y antecedentes gráficos	Medio	Medio	Carlos Abarza: Lectura y revisión de claridad del diagnóstico, distinción entre hechos e interpretaciones, escenarios de demanda y referencia al hito H1.
2.3 Dimensionamiento	Asistente LLM y generación de imágenes	Dimensionamiento y presentación gráfica de la cadena causal	Medio	Medio	Carlos Abarza: Lectura y revisión de consistencia de cifras, unidades, cálculos y distinción entre cobros objetados y pérdidas demostradas.
2.4 Actores y Grupos de Interés	Asistente LLM y generación de imágenes	Mapeo de 13 actores y presentación gráfica de la matriz de poder e interés	Medio	Medio	Carlos Abarza: Lectura, aclaración del criterio colectivo de poder e interés, cuadrantes vacíos y coherencia de arbitraje y referencias a S3.
2.5 Requerimientos y Supuestos	Asistente LLM	Estandarización de matriz de supuestos de proyecto	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de claridad de necesidades, supuestos, exclusiones y restricciones; coherencia del monitoreo térmico con la innovación 3.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexos 2.A a 2.E	Asistente LLM y Codex	Estructuración tabular de inventarios, fichas y registro de 26 decisiones; distinción de REQ-NEG-08 como necesidad preliminar atendida fuera del catálogo base S3/T-12	Medio	Ninguno	Carlos Abarza: Lectura y revisión de consistencia entre catálogos y cuerpo de S2, inventarios y clasificación de actores; aclaración de REQ-NEG-08 dentro de la oferta.
